MINISTERUL AFACERILOR INTERNE AL REPUBLICII MOLDOVA

RAPORT
de evaluare finală a Programului de prevenire și gestionare a situațiilor de urgență și excepționale pentru anii 2022-2025



2026

Ministerul Afacerilor Interne
mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 75
tel. +373(22) 255 830, e-mail: secretariat@mai.gov.md,
pagina web: www.mai.gov.md

1. Sumarul executiv

Raportul curent are ca obiect evaluarea progresului înregistrat la implementarea, în perioada 2022-2025, Programului de prevenire și gestionare a situațiilor de urgență și excepționale pentru anii 2022-2025 (în continuare - *Program*), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 846/2022. Raportul este parte a unui exercițiu de evaluare a progresului înregistrat în perioada anilor 2022-2025 în implementarea tuturor celor șase programe sectoriale privind subdomeniile de competență ale Ministerului Afacerilor Interne (*în continuare* - MAI), aferente Strategiei de dezvoltare a domeniului afacerilor interne pentru anii 2022-2030 (*în continuare* - SDDAI pentru anii 2022-2030), aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 658/2022.

Programul a fost elaborat în baza unui concept axat pe exemplul Mecanismului de protecție civilă al Uniunii Europene, care este format din trei componente principale: prevenire, pregătire și răspuns la situații de urgență și excepționale și indică direcția de dezvoltare a țării în domeniul gestionării situațiilor de urgență și excepționale.

Obiectivele de dezvoltare ale prezentului Program sunt raliate la obiectivele vizând prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență din SDDAI pentru anii 2022-2030, care se referă la consolidarea rolului de autoritate în domeniul situațiilor de urgență și excepționale, eficientizarea măsurilor de prevenire a situațiilor de urgență și excepționale, modernizarea sistemului național de pregătire pentru situații de urgență și excepționale, sporirea capacității operaționale și de răspuns în situații de urgență și excepționale.

Scopul Programului constă în consolidarea capacităților autorităților administrației publice centrale și locale în gestionarea situațiilor de urgență și excepționale, prin îmbunătățirea interacțiunii instituționale și dezvoltarea mecanismelor de prevenire, pregătire, intervenție și răspuns în domeniul protecției civile, în vederea salvării vieților omenești și reducerii pagubelor materiale cauzate de acestea.

Obiectivele de dezvoltare ale prezentului Program sunt aliniate la obiectivele Strategiei de dezvoltare a domeniului afacerilor interne pentru anii 2022-2030, care se referă la eficientizarea măsurilor de prevenire a situațiilor de urgență și excepționale, modernizarea sistemului național de pregătire și sporirea capacității operaționale și de răspuns în astfel de situații.

Programul a vizat 4 obiective generale, 13 obiectivele specifice, 63 acțiuni și 78 produse. Gradul de realizare a acestora a fost apreciat în baza unei metodologii unice având ca referință indicatorii de impact, de rezultat și de monitorizare.

Aspectele calitative și cantitative privind rezultatele obținute în procesul de implementare a Programului reflectă progresul înregistrat în atingerea obiectivelor stabilite pentru perioada 2022-2025. Datele furnizate de autoritățile responsabile indică nivelul de realizare a acțiunilor planificate conform Planului de acțiuni.

Aspectele calitative și cantitative privind rezultatele obținute în procesul de implementare

În urma evaluării finale s-a constatat că indicatorii de impact au înregistrat progrese, după cum urmează: 75% au atins țintele stabilite pentru perioada de implementare, 25% sunt în întârziere, adică valoarea constatată la finele anului 2025 este opusă dinamicii planificate conform programului.

Analiza ritmului de avansare a indicatorilor de rezultat privind cele 13 de obiective specifice arată că 4 obiective specifice (31%) au înregistrat valori conform planului a indicatorilor de rezultat, 6 obiective specifice (46%) au înregistrat valori întârziate, 1 obiectiv specific (8%) fiind în regres, iar 2 obiective specifice (15%) nu au putut fi evaluate, întrucât nu se cunoaște formula utilizată la stabilirea valorii de referință. Pe de altă parte, rata de realizare a produselor pe obiective generale stabilite pentru anul 2022-2025 constituie 70%. Din cei 78 indicatori de monitorizare prevăzuți în Planul de acțiuni, 55 indicatori au fost realizați, 15 indicatori sunt în proces (progres avansat) de realizare, 3 indicatori sunt nerealizați și 5 indicatori sunt neinițiați.

Totodată, la finele anului 2025, nivelul de realizare a indicatorilor de monitorizare aferenți Planului este următorul:

- 55 - realizați - **71 %**;
- 15 - în proces (progres avansat) - **19 %**;
- 3 - nerealizați - **4 %**;
- 5 - neinițiați - **6 %**.

Graficul nr. 1. Gradul de realizare a indicatorilor de monitorizare, pentru anii 2022-2025

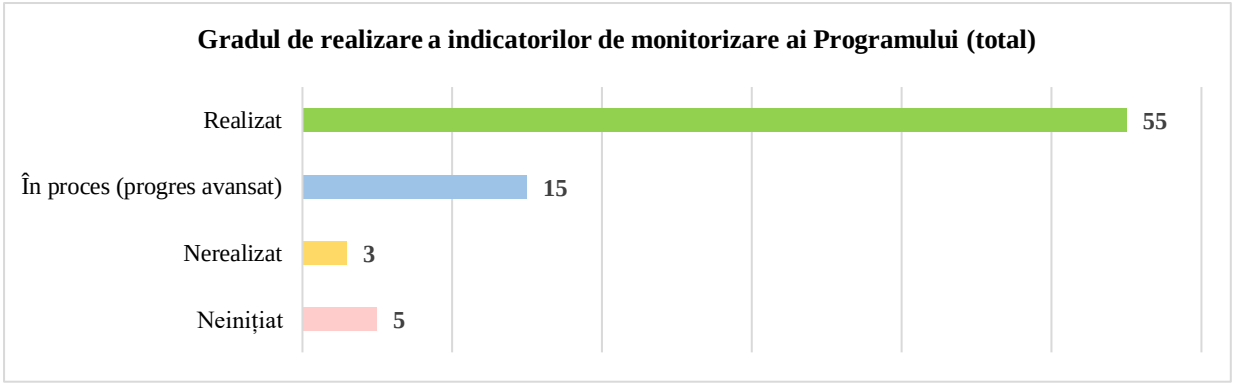

Concluzii și recomandări

Întru realizarea prevederilor Programului menționat au fost întâmpinate unele dificultăți, după cum urmează:

- lipsa alocațiilor resurselor financiare necesare pentru implementarea acțiunilor planificate;
- lipsa unei conlucrări cu Ministerul Sănătății privind stabilirea competențelor și atribuțiilor echipajelor de intervenție în timpul efectuării misiunilor de acordare a asistenței medicale urgente și primului ajutor.

Se constată faptul că Programul a înregistrat progres de peste 71 % la sută la toate nivelurile de implementare, adică la nivel de impact, rezultat și, propriu-zis, la realizarea indicatorilor de monitorizare.

2. Introducere

Descrierea succintă a Programului

În perioada anilor 2022-2025, Ministerul Afacerilor Interne și subdiviziunile subordonate au desfășurat evaluarea progresului privind implementarea SDDAI pentru anii 2022-2030 și a celor șase programe sectoriale privind subdomeniile de competență ale MAI pentru anii 2022-2025.

Acest raport prezintă rezultatele evaluării finale pentru anii 2022-2025 a Programului de prevenire și gestionare a situațiilor de urgență și excepționale pentru anii 2022-2025 și a Planului de acțiuni privind implementarea acestuia, realizată în conformitate cu prevederile punctului 3, subpunctul 3 al din Hotărârea Guvernului nr. 846/2022.

Cele 4 obiective generale sunt susținute de 13 obiective specifice, iar Planul de acțiuni prevede 63 de acțiuni cu 78 *indicatori de monitorizare* pentru cei patru ani de implementare.

Scopul evaluării

Programul evidențiază un ansamblu de măsuri orientate spre consolidarea capacităților de prevenire, pregătire, operaționale și răspuns în situații de urgență. Aceste acțiuni vizează atât activitatea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne (în continuare - *IGSU al MAI*), în calitatea sa de autoritate specializată, cât și a altor instituții și actori cu atribuții în domeniu, care fac parte din sistemul național de protecție civilă.

Scopul evaluării finale a Programului este de a analiza gradul de realizare a obiectivelor stabilite, de a identifica rezultatele obținute și impactul generat de implementarea acestuia, precum și de a formula recomandări pentru îmbunătățirea implementării politicilor în perioada următoare. În acest sens, evaluarea oferă o imagine de ansamblu asupra progresului realizat.

Raportul de evaluare urmărește, în principal, analiza progresului general în realizarea obiectivelor Programului, identificarea domeniilor în care au fost înregistrate rezultate semnificative sau, dimpotrivă, a situațiilor în care există diferențe între obiectivele stabilite și rezultatele obținute. Totodată, acesta oferă repere pentru o alocare mai eficientă a resurselor și evidențiază exemple de bune practici care pot fi valorificate în programele viitoare.

Astfel, evaluarea aferentă perioadei 2022-2025 prezintă modul în care Programul a fost implementat pe întreaga durată de aplicare și măsura în care obiectivele stabilite au fost atinse. Raportul reflectă principalele realizări, dificultățile întâmpinate în procesul de implementare și modul în care acestea au fost gestionate, formulând totodată concluzii și recomandări pentru îmbunătățirea acțiunilor viitoare.

Metodologia de evaluare utilizată

Evaluarea finală a Programului a fost desfășurată cu respectarea prevederilor Metodologiei de evaluare finală a Strategiei de dezvoltare a domeniului afacerilor interne pentru anii 2022 2030 și a Programelor sectoriale privind subdomeniile de competență ale Ministerului Afacerilor Interne pentru anii 2022-2025, aprobată prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 671 din 27.11.2025.

Evaluarea finală a Programului a fost desfășurată în câteva etape, pentru fiecare din ele fiind stabilite metode de colectare, procesare și redare a informației și datelor acumulate.

I. Colectarea informației

Această etapă a fost realizată în lunile octombrie-noiembrie 2022-2025 și a presupus utilizarea mai multor metode de colectare a informațiilor: solicitarea datelor și informațiilor de la instituțiile și autoritățile responsabile de implementare, privind progresul în implementarea Programului în perioada anilor 2022-2025; accesarea datelor statistice și a documentelor relevante care reflectă evoluții privind indicatorii evaluați; observare directă a produselor și rezultatelor generate.

II. Analiza, verificarea și interpretarea informației

Această etapă a fost realizată în perioada lunilor decembrie 2025-februarie 2026. La această etapă au fost analizate și interpretate datele acumulate, fiind apreciat gradul de progres înregistrat în implementarea Programului.

La nivel de Impact, a fost efectuată analiza gradului de realizare a **indicatorilor de impact pentru fiecare obiectiv general**, fiind apreciați cu una din cele cinci variante posibile *Devansare / Conform Planului / Întârziere / Regres / Nu poate fi evaluat* corespunzător cu descifrarea din tabel.

La nivel de Rezultate, a fost analizat gradul de realizare a **indicatorilor de rezultat pentru fiecare obiectiv specific**, fiind apreciați cu una din cele cinci variante posibile *Devansare / Conform Planului / Întârziere / Regres / Nu poate fi evaluat* corespunzător cu descifrarea din tabel.

Tabelul nr. 1. Descifrarea statutului gradului de realizare a indicatorilor de impact și de rezultat.

Statutul gradului de realizare a indicatorului de impact / de rezultat	**Descifrarea**
Devansare	Valoarea constatată la finele anului 2025 este semnificativ mai mare decât valoarea țintă (2025)
Conform planului	Valoarea constatată la finele anului 2025 este egală (sau aproximativ egală) cu valoarea țintă (2025)
Întârziere	Valoarea constatată la finele anului 2025 este semnificativ mai apropiată de valoarea de referință (2022) decât de valoarea țintă (2025)
Regres	Valoarea constatată la finele anului 2025 este opusă dinamicii planificate conform programului
Nu poate fi evaluat	Datele privind valoarea indicatorului de impact nu sunt disponibile

La nivel de Implementare, a fost analizat gradul de realizare a **indicatorilor de monitorizare** planificați pentru fiecare acțiune. Gradul de realizare a produselor a fost apreciat cu una din cele patru variante posibile: *Realizat / În proces (progres avansat) / Nerealizat / Neinițiat*, corespunzător cu descifrarea din tabel.

Tabelul nr. 2. Descifrarea statutului gradului de realizare a indicatorilor de monitorizare.

Statutul gradului de realizare a indicatorului de monitorizare	**Descifrarea**
Realizat	Produsul planificat a fost finalizat în termenul planificat.
În proces (progres avansat)	Produsul planificat nu a fost finalizat, termenul a fost depășit, dar au fost întreprinse acțiuni semnificative pentru realizare.
Nerealizat	A început realizarea produsului planificat, iar termenul a fost depășit.
Neinițiat	Nu a început realizarea produsului.

La nivel de Costuri, a fost analizat **gradul de finanțare și sursa de finanțare** a fiecărei acțiuni incluse în Planul de acțiuni. Gradul de finanțare a acțiunii a fost apreciat cu una din cele trei variante posibile: *Finanțat / Subfinanțat / Nefinanțat,* corespunzător cu descifrarea din tabel.

Tabelul nr. 3. Descifrarea statutului gradului de finanțare a acțiunilor.

Statutul gradului de finanțare a acțiunii	**Descifrarea**
Finanțat	Au fost alocate resurse financiare necesare pentru realizare.
Subfinanțat	Au fost alocate parțial resurse financiare necesare pentru realizare.
Nefinanțat	Nu au fost alocate resurse financiare necesare pentru realizare.

III. Formularea constatărilor și recomandărilor.

Această etapă a fost realizată în luna decembrie 2025, în baza unei structuri tip de raport comună pentru toate programele evaluate, care include grafice și tabele de sinteză a datelor prezentate și în raportul curent.

Constrângeri în procesul de evaluare

1. Suprapunerea cu alte activități cotidiene și procesul de actualizare anuală a documentelor de planificare.

Procesul de evaluare a fost realizat concomitent cu atribuțiile cotidiene ale personalului MAI, care, totodată, a fost antrenat în activitățile de pregătire și desfășurare a procesului anual de actualizare a documentelor de planificare.

2. Dificultăți în evaluarea financiară a Programului.

O altă constrângere semnificativă a fost absența unei evidențe clare și centralizate a finanțării, având în vedere că sursele de finanțare au fost multiple, iar fluxul fondurilor nu a fost monitorizat suficient de riguros. Această situație a făcut dificilă determinarea exactă a resurselor financiare alocate și utilizate pentru implementarea acțiunilor prevăzute în Program. În lipsa unei contabilități clare a cheltuielilor, evaluarea financiară nu a putut fi realizată în mod exhaustiv și precis, afectând astfel concluziile privind eficiența utilizării fondurilor.

3. **Fluctuația de personal**.

Un impediment semnificativ în desfășurarea procesului de evaluare l-a constituit fluctuația angajaților implicați în elaborarea și implementarea Programului, precum și în activitatea de evaluare propriu-zisă. Această situație a afectat continuitatea gestionării activităților, generând dificultăți de coordonare și raportare. Totodată, personalul nou încadrat nu a beneficiat, în toate cazurile, de timpul necesar pentru a se familiariza cu toate aspectele relevante, fapt ce a determinat o abordare fragmentată a procesului de evaluare.

3. Constatări

3.1 Constatări privind impactul Programului

Pentru consolidarea domeniului situațiilor de urgență și excepționale, evaluarea finală a Programului a evidențiat necesitatea îmbunătățirii cadrului normativ care reglementează activitățile în domeniile de prevenire, pregătire și răspuns, în vederea eliminării lacunelor legislative și eficientizării gestionării acestor situații.

Din analiza celor patru obiective generale ale Programului, două **Obiective generale nr. 2 și nr. 3** au înregistrat o dinamică pozitivă a impactului produs, fiind apreciate cu statutul ***conform planului***, iar **Obiectivul general nr. 4** a înregistrat ***devansare***. Indicatorul de impact pentru **Obiectivul general nr. 1** a fost apreciat în ***întârziere***, datorită faptului că nu toate actele au fost aprobate în termenii stabiliți.

În context, urmare a evaluării indicatorului de impact „*Îmbunătățirea cadrului normativ*” aferent ***Obiectivului general 1*** „*Consolidarea rolului de autoritate în domeniul situațiilor de urgență și excepționale*”, s-a constatat ***întârziere***, întrucât, pe parcursul anilor 2022-2025, au fost elaborate și aprobate doar 8 acte normative din cele 16 planificate, după cum urmează:

1. Legea nr. 346/2023 pentru modificarea Legii voluntariatului nr. 121/2010.
2. Legea nr. 182/2024 pentru modificarea Legii nr. 104/2020 cu privire la rezervele de stat și de mobilizare.
3. Hotărârea Guvernului nr. 504/2025 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 961/2006 cu privire la aprobarea Regulamentului rețelei naționale de observare și control de laborator asupra contaminării (poluării) mediului înconjurător cu substanțe radioactive, otrăvitoare, puternic toxice și agenți biologici.
4. Hotărârea Guvernului nr. 749/2025 cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 282/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind instruirea în domeniul protecției civile.
5. Hotărârea Guvernului nr. 776/2024 pentru modificarea Regulamentului privind gestionarea fondurilor de urgență ale Guvernului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 862/2015, și abrogarea unei hotărâri a Guvernului și Hotărârea Guvernului nr. 19/2024 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1340/2001 cu privire la Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova.
6. Hotărârea Guvernului nr. 675/2023 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de efectuare a misiunilor transfrontaliere cu ambulanțele Serviciului mobil de urgență, reanimare și descarcerare (SMURD).

7. Hotărârea Guvernului nr. 500/2024 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1076/2010 cu privire la clasificarea situațiilor excepționale și la modul de acumulare și prezentare a informațiilor în domeniul protecției populației și teritoriului în caz de situații excepționale.

8. Ordinul IGSU nr. 297/2023 cu privire la aprobarea Regulamentului de activitate a echipajelor de prim ajutor calificat a Serviciului mobil de urgență reanimare și descarcerare.

Apreciind gradul de realizare a ***Obiectivului general 2*** „*Eficientizarea măsurilor de prevenire a situațiilor de urgență și excepționale*”, s-a constatat rezultatul ***conform planului*** a indicatorului de impact „*Creșterea gradului de conștientizare al populației cu 3%*”.

Pe parcursul anului 2024, IGSU al MAI a elaborat Studiul de fezabilitate și documentația conexă pentru implementarea Sistemului de avertizare publică „MD-ALERT” în Republica Moldova. Studiul de fezabilitate face parte din cadrul proiectului MD-ALERT-STUDY, finanțat de Uniunea Europeană, (sistem de avertizare similar celor implementate în țările membre ale Uniunii, conform standardelor Uniunii Europene). Conceptul Sistemului de avertizare publică „MD-ALERT” a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 112 din 18 martie 2026.

Totodată, începând cu 1 ianuarie 2025, IGSU al MAI a demarat implementarea proiectului „*Consolidarea managementului riscului de dezastre și rezilienței la schimbările climatice în Republica Moldova*”, unul din obiective fiind instalarea și operaționalizarea unui sistem de avertizare publică, bazat pe tehnologia „Cell Broadcast”, care permite transmiterea mesajelor de avertizare de interes public în timp real către persoanele expuse la pericole, oferind un mijloc sigur și rapid de diseminare a informațiilor. Sistemul este preconizat să devină funcțional până la finele anului 2027.

În acest context, pe parcursul anului 2025 a fost definitivată documentația pentru procedura de achiziție a echipamentelor, în conformitate cu cerințele Băncii Mondiale (bidding documents), împreună cu experții acesteia.

Creșterea gradului de conștientizare al populației s-a datorat faptului desfășurării anuale a circa 10-15 campanii de informare, prin care au fost informate și instruite 700 de mii de persoane în aproximativ 92% din localitățile țării. La fel, au fost realizate 5 spoturi video cu caracter informativ și preventiv. De asemenea, au fost înregistrate 7586 apariții în mass-media (TV, radio, ziare, portaluri de știri), iar pe rețelele de socializare au fost distribuite 126 de materiale informative și de prevenție.

În același context, în vederea creșterii capacității de intervenție, informare și reducere a riscurilor la nivel regional, au fost implementate și operaționalizate 2 module regionale mobile de prevenire. Drept urmare, a fost elaborat un program comun de instruire, destinat echipelor de salvatori și pompierilor, în cadrul cărora au fost instruiți 15 angajați ai IGSU al MAI în domeniul stingerii incendiilor forestiere. Totodată, în anul 2025, a fost desfășurată activitatea „Școala Forestieră 2025”, la care au participat și au fost instruiți 100 de copii.

Aceste activități au fost însoțite de demersuri orientate spre perfecționarea cadrului normativ în domeniul evaluării naționale a riscurilor aferente situațiilor de urgență și excepționale.

În acest context, a fost elaborat proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Metodologiei naționale de evaluare a riscurilor situațiilor de urgență/excepționale.

Suplimentar, în vederea sporirii nivelului de instruire a copiilor și elevilor din instituțiile de învățământ cu privire la gestionarea situațiilor de risc (inclusiv riscurile aferente situațiilor de urgență și excepționale), pe parcursul implementării Programului au fost desfășurate mai multe activități specifice de instruire privind cunoștințe de bază de prevenire a riscurilor și comportament sigur în situații de urgență și excepționale.

La ***Obiectivul general 3*** „*Modernizarea sistemului național de pregătire pentru situații de urgență și excepționale*”, s-au înregistrat rezultate ***conform planului*** a indicatorului de impact planificat, care prevede *creșterea gradului de pregătire a serviciilor de urgență și a populației cu 10/2%.*

Obiectivul menționat a fost realizat ca urmare executării acțiunilor privind dezvoltarea capacităților naționale de pregătire și instruire în situații de urgență și excepționale, inclusiv prin reconstrucția edificiului Centrului republican de instruire al IGSU al MAI, precum și prin înființarea, dotarea și amenajarea poligoanelor de instruire. Ca urmare, au fost elaborate programe de instruire și curriculum de studii, ceea ce a permis organizarea și desfășurarea orelor și cursurilor de instruire atât a angajaților IGSU al MAI, cât și pentru populației.

Totodată, angajații IGSU al MAI au participat la instruiri și exerciții atât la nivel național, cât și internațional, ceea ce a facilitat schimbul de experiență și preluarea bunelor practici.

Au fost desfășurate exerciții și aplicații practice în domeniul protecție civile, cu antrenarea autorităților publice locale și centrale, precum și a sectorului privat și asociativ. De asemenea, a fost acordat suport autorităților publice locale în procesul de actualizare a strategiilor și planurilor de gestionare a situațiilor de urgență și excepționale.

Dezvoltarea infrastructurii depozitelor Agenției Rezerve Materiale a fost asigurată prin consolidarea capacităților rezervelor de stat și de mobilizare, achiziționarea de bunuri pentru completarea acestora, precum și prin efectuarea lucrărilor de reparație a acoperișurilor unor edificii (depozite) aflate în gestiunea instituției.

Indicatorului de impact al ***Obiectivului general 4*** „*Sporirea capacității operaționale și de răspuns în situații de urgență și excepționale*”, a urmărit reducerea timpului de reacție la 15 minute pentru 4% anual, din numărul total de intervenții, înregistrând o ***devansare*** a indicatorului stabilit.

Misiunile de intervenție efectuate demonstrează o reducere a timpului de intervenție pentru 60% din misiuni, și anume:

- în anul 2022 din cele 22179 de misiuni de urgență, 59% au avut un timp de reacție de până la 15 minute;

- în anul 2023 din cele 14.727 de misiuni de urgență, 61% au avut un timp de reacție de până la 15 minute;
- în anul 2024 din cele 24.947 de misiuni de urgență, 56% au avut un timp de reacție de până la 15 minute;
- în anul 2025 din cele 25.070 de misiuni de urgență, 54% au avut un timp de reacție de până la 15 minute.

Totodată, lipsa alocării de mijloace financiare din bugetul de stat a condus la sistarea completă a activităților echipajelor Serviciul Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare (în continuare - *SMURD*) din cadrul intervențiilor comune. Acest fapt a determinat indisponibilitatea funcțiilor de paramedic necesare pentru operaționalizarea echipajelor de prim ajutor calificat SMURD din cadrul IGSU al MAI.

Tabelul nr. 4. Gradul de realizare a indicatorilor de impact

Obiectivul general	Indicator de impact	Valoarea de referință (2022)	Ținta care urmează a fi atinsă (2025)	Valoarea înregistrată la finalul anului 2025	Progres
Obiectivul general 1 Consolidarea rolului de autoritate în domeniul situațiilor de urgență și excepționale	Îmbunătățirea cadrului normativ	-	16	8 (50%)	**Întârziere**
Obiectivul general 2 Eficientizarea măsurilor de prevenire a situațiilor de urgență și excepționale	Creșterea gradului de conștientizare al populației cu 3%	64% (2021)	67%	67%	**Conform planului**
Obiectivul general 3 Modernizarea sistemului național de pregătire pentru situații de urgență și excepționale	Creșterea gradului de pregătire a serviciilor de urgență și a populației cu 10/2 %	45/2	55/4	54,7% / 3,9%	**Conform planului**
Obiectivul general 4 Sporirea capacității operaționale și de răspuns în situații de urgență și excepționale	Timp redus la 15 minute pentru 4% anual, din numărul total de intervenții	24% (2021)	40%	57,5% (media pentru 4 ani)	**Devansare**

3.2 Constatări privind rezultatele Programului

Implementarea obiectivelor specifice stabilite în prezentul Program a asigurat un management eficient și coordonat al activităților de prevenire și intervenție în situații de urgență, în vederea consolidării capacității de răspuns, a protejării vieților omenești, a bunurilor materiale și a mediului înconjurător. Aceste măsuri au generat un impact pozitiv asupra creșterii nivelului de siguranță a populației, reducerii timpului de intervenție, precum și asupra diminuării efectelor situațiilor de urgență și excepționale, inclusiv ale incendiilor și altor riscuri asociate.

Din analiza ritmului de realizare a indicatorilor de rezultat privind obiectivele specifice aferente celor 4 obiective generale se constată că, la finele perioadei de implementare a Programului, 2 indicatori au fost implementați prin ***devansare*** (15%), ***conform planului*** - 4 indicatori (31%) și în ***întârziere*** - 5 indicatori (39%). Totodată, pentru 2 indicatori (15%) progresul înregistrat ***nu poate fi evaluat***.

Graficul nr. 1. Ritmul de avansare a indicatorilor de rezultat (Obiective generale)

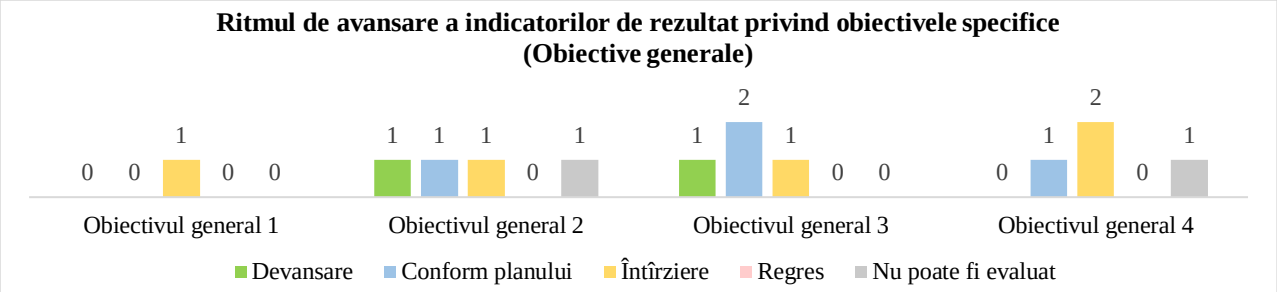

Obiectivul specific 1.1 „*Perfecționarea legislației în domeniul situațiilor de urgență și excepționale*”, a înregistrat o ***întârziere*** la finele anului 2025.

Pe parcursul anilor 2022-2025 au fost elaborate și adoptate mai multe proiecte de acte normative relevante pentru domeniul protecției civile și apărării împotriva incendiilor.

Astfel, au fost operate modificări la Legea voluntariatului nr. 121/2010, prin adoptarea Legii nr. 346/2023, fapt ce a permis extinderea domeniilor de voluntariat.

De asemenea, a fost aprobat Regulamentul de activitate a echipajelor de prim ajutor calificat a Serviciului mobil de urgență reanimare și descarcerare, prin Ordinul IGSU al MAI nr. 297/2023, precum și Regulamentul privind procedura de efectuare a misiunilor transfrontaliere cu ambulanțele Serviciului mobil de urgență, reanimare și descarcerare (SMURD), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 675/2023.

Pe parcursul anului 2024, au fost operate modificări privind actualizarea componenței Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova (Hotărârea Guvernului nr. 19/2024).

A fost reglementat termenul (de până la 90 de zile) după producerea situațiilor excepționale, în care organele centrale de specialitate ale administrației publice și autoritățile administrației publice locale întocmesc și prezentă IGSU al MAI rapoarte cu privire la situațiile excepționale (Hotărârea Guvernului nr. 500/2024).

Prin Hotărârea Guvernului nr. 749/2025, a fost actualizat Planul de pregătire a protecției civile, precum și a Regulamentului privind gestionarea fondurilor de urgență ale Guvernului, prin completarea acestuia cu prevederi referitoare la fondul de intervenție.

De asemenea, ca urmare a adoptării Hotărârii Guvernului nr. 504/2025, au fost aduse completări Hotărârii Guvernului nr. 961/2006, prin introducerea unor noțiuni precum cercetarea materialelor Chimice, Biologice, Radiologice și Nucleare (CBRN), decontaminarea CBRN și echipa de intervenție CBRN. În acest context, au fost revizuite și actualizate atribuțiile autorităților participante în cadrul organizării observării și controlului de laborator, precum și ajustată lista instituțiilor și laboratoarelor rețelei naționale de observare și control de laborator.

Subsidiar, unele acte normative nu au fost adoptate, întrucât a devenit necesară revizuirea, alinierea și corelarea acestora cu noile reglementări instituite prin Legea nr. 248/2025 privind managementul situațiilor de criză.

Tabelul nr. 5. Gradul de realizare a indicatorilor de rezultat (Obiectivul 1)

Obiectivul specific	Indicator de rezultat al politicii publice	Valoarea de referință (2022)	Ținta care urmează a fi atinsă (2025)	Valoarea înregistrată la finalul anului 2025	Progres
Obiectivul specific 1.1. Perfecționarea legislației în domeniul situațiilor de urgență și excepționale	Cel puțin 4 acte normative noi elaborate și cel puțin 12 intervenții normative în cadrul normativ actual	-	16	8	**Întârziere**

Obiectivul specific 2.1. „*Operaționalizarea până în anul 2025 a sistemului național de avertizare timpurie*” nu a fost înregistrat progres - ***întârziere*** (*acțiune transferată pentru anul 2026*). Obiectivul vizat urmărește crearea unui Sistem de avertizare publică.

În perioada de referință, a fost elaborat studiul de fezabilitate și documentația conexă pentru implementarea Sistemului de avertizare publică „MD-ALERT” în Republica Moldova. În anul 2026 a fost adoptată Hotărârea Guvernului nr. 112/2026 cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului de avertizare publică „MD-ALERT”.

Obiectivul specific 2.2 „*Consolidarea activității de comunicare și informare preventivă*” a înregistrat o ***întârziere***.

Obiectivul a vizat crearea a 3 module operaționale de prevenire, însă până la finele anului 2025 au fost create și operaționalizate 2 module regionale mobile.

În anul 2023, în cadrul Proiectului „Donare de echipament pentru Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și instruire în domeniul comunicării pe timp de criză”, a fost recepționat un lot de echipament tehnic necesar desfășurării acțiunilor de prevenire și comunicare cu publicul.

Totodată, în perioada de referință au fost desfășurate circa 40 de campanii și activități de informare și prevenire, fiind informate 2.403.230 de persoane, dintre care 331.742 de copii. Concomitent, au fost realizate 7.067 apariții în mass-media (presa scrisă, mijloace audiovizuale și internet, inclusiv rețele sociale) și distribuite 758.235 pliante.

Crearea celui de-al 3-lea modul de prevenire operațională nu a fost posibilă din cauza insuficienței resurselor financiare, fapt care a afectat realizarea deplină obiectivului specific.

Obiectivul specific 2.3 „*Sporirea până în anul 2025 a gradului de integrare și implicare a voluntariatului în viața comunității*”, a înregistrat rezultatul ***devansare***.

Pe parcursul anilor 2022-2025 au fost semnate 11 acorduri de parteneriat între autoritățile Administrația publică locală și IGSU al MAI. Ca rezultat, au fost deschise/reabilitate 7 posturi de salvatori și pompieri, fiind instruiți 411 pompieri voluntari. De asemenea, unele posturi au fost dotate cu 25 de autospeciale de intervenție, fiind realizată totodată instruirea formatorilor din cadrul IGSU al MAI și a pompierilor voluntari.

Obiectivul specific 2.4 „*Creșterea calității procesului instituțional de expertiză în prevenirea situațiilor de urgență*”, indicatorul de rezultat fiind „cel puțin 2 genuri de expertiză acreditate”, care au fost calificate ***nu poate fi evaluat***.

În cadrul acestui obiectiv, Laboratorul chimic-radiometric al IGSU al MAI a fost dotat cu echipament de laborator și de mentenanță.

A fost elaborat parțial Manualul calității, în conformitate cu cerințele standardului SM EN ISO/IEC 17025:2018 și ale Ghidului ILAC-G19:08/2014.

Totodată, în vederea dezvoltării capacităților profesionale, 2 angajați ai IGSU al MAI au participat la cursul de instruire „Operațiuni în caz de accidente chimice, biologice, radiologice și nucleare (CBRN) - exploatare și mentenanță echipament", organizat de Agenția de Apărare și Reducere a Amenințărilor (DTRA) din cadrul Departamentului de Apărare al SUA.

Realizarea obiectivului nu a fost posibilă din cauza lipsei finanțării necesare pentru această acțiune.

Tabelul nr. 6. Gradul de realizare a indicatorilor de rezultat (Obiectivul 2)

Obiectivul specific	Indicator de rezultat al politicii publice	Valoarea de referință (2022)	Ținta care urmează a fi atinsă (2025)	Valoarea înregistrată la finalul anului 2025	Progres
Obiectivul specific 2.1 Operaționalizarea până în anul 2025 a sistemului național de avertizare timpurie	Sistem de avertizare creat	-	2	0	**Întârziere**
Obiectivul specific 2.2 Consolidarea activității de comunicare și informare preventivă	3 module de prevenire operaționale	0	3	2	**Întârziere**
Obiectivul specific 2.3 Sporirea până în anul 2025 a gradului de integrare și implicare a voluntariatului în viața comunității	7 posturi de salvatori și pompieri voluntari instituite; 250 de voluntari instruiți	17/336	24/586	24/747	**Devansare**
Obiectivul specific 2.4 Creșterea calității procesului instituțional de expertiză în prevenirea situațiilor de urgență	Cel puțin 2 genuri de expertiză acreditate	0	2	0	**Nu poate fi evaluat**

Obiectivul specific 3.1 „*Dezvoltarea capacităților naționale de pregătire și instruire în situații de urgență și excepționale*", a înregistrat un progres ***conform planului***.

În perioada trimestrului IV 2022 și trimestrul I 2023 au fost finalizate lucrările de renovare și a fost inaugurat noul sediu al Centrului republican de instruire al IGSU al MAI din com. Răzeni, r. Ialoveni (fiind renovate 2 sedii). Create și operaționalizate 6 module de instruire și achiziționate 6 seturi de echipamente pentru activitățile de instruire. S-au elaborat 17 curriculum-uri noi de instruire și 4 programe de instruire, precum și au fost instruiți 2.235 de angajați din cadrul subdiviziunilor IGSU al MAI.

De asemenea, numărul de formatori în cadrul IGSU al MAI a crescut de la 10 angajați în anul 2021, la 35 angajați/formatori la finele anului 2025.

Instruirea diferitor categorii de populație în domeniul protecției civile, apărării împotriva incendiilor și acordării primului ajutor, a cuprins un număr total de 9.414 de persoane în perioada anilor 2022-2025.

Obiectivul specific 3.2 „*Valorificarea oportunităților de participare la instruiri/exerciții pe plan internațional*”, a fost implementat ***conform planului***.

În perioada 2022-2025, 421 de angajați din cadrul subdiviziunilor IGSU al MAI au participat la 41 de cursuri de instruire, dintre care 28 desfășurate în cadrul programelor Mecanismului de Protecție Civilă al Uniunii Europene, atât la nivel național, cât și internațional (Georgia, Norvegia, Polonia, România, Bulgaria, Germania, Austria, Letonia și Turcia).

De asemenea, în anul 2025, 83 de persoane din cadrul structurilor statului și experți internaționali au participat la exercițiul de comandă și simulare asistată de calculator privind acțiunile de răspuns la situații de urgență și excepționale „Resolute Savior 25”, organizat cu suportul Centrului de Excelență pentru Managementul Crizelor din Bulgaria și al Oficiul de legătură NATO în Republica Moldova.

Obiectivul specific 3.3 „*Fortificarea capacităților grupurilor-țintă (populației, autorităților administrației publice, sectorului privat, asociativ și voluntar) în gestionarea situațiilor de urgență și excepționale*”. În perioada de raportare s-a înregistrat o ***devansare*** a acestui obiectiv.

În perioada 2022-2025 au fost elaborate 2 programe de formare profesională inițială pentru subofițeri și ofițeri, precum și elaborate și revizuite 5 curriculumuri.

În aceeași perioadă, au fost desfășurate 129 de aplicații tactice și antrenamente, cu participarea a 10.628 de persoane. De asemenea, în cadrul Centrului republican de instruire al IGSU al MAI au fost instruite 9.414 persoane, în cadrul programelor de pregătire.

Printre realizările relevante se numără organizarea unei vizite de lucru în zonele cu risc sporit de incendii de vegetație din municipiul Soroca, în comun cu APL și reprezentanții programului PPRD East-3, participarea la ședința grupului de lucru privind posibilitatea implementării buletinelor meteorologice, cu participarea reprezentanților programului PPRD East-3 și ai Serviciul Hidrometeorologic de Stat, precum și organizarea atelierului de lucru „Planificarea de urgență pentru zona-pilot mun. Soroca”.

Obiectivul specific 3.4 „*Eficientizarea la finele anului 2025 a activității de administrare și consolidare a capacității rezervelor de stat și de mobilizare*”, a înregistrat un progres ***conform planului***.

În perioada de referință au fost aprobate Nomenclatoarele bunurilor din rezervele de stat și de mobilizare ale Agenției Rezerve Materiale, prin Hotărâre de Guvern în anul 2024.

Au fost efectuate procurări pentru completarea rezervelor de stat în valoare de 580.687,5 mii lei și pentru rezervele de mobilizare în valoare de 64.042,5 mii lei.

Totodată, au fost realizate lucrări de reparație a edificiilor și construcțiilor din gestiunea Agenției Rezerve Materiale, amplasate în mun. Bălți, Comrat și Chișinău, precum și în s. Curchi, r. Orhei.

De asemenea, a fost elaborat Planul operativ de intervenție privind eliberarea bunurilor în situații de urgență și excepționale, iar în anul 2025 au fost desfășurate 2 antrenamente practice privind recepționarea/eliberarea, în regim operativ, a bunurilor din rezerve.

Suplimentar, a fost propusă acțiunea de creare a unei baze petroliere gestionată de Agenția Rezerve Materiale, însă s-a constatat că, acesta nu este justificată din punct de vedere economic și nu poate fi realizată.

Tabelul nr. 7. Gradul de realizare a indicatorilor de rezultat (Obiectivul 3)

Obiectivul specific	Indicator de rezultat al politicii publice	Valoarea de referință (2022)	Ținta care urmează a fi atinsă (2025)	Valoarea înregistrată la finalul anului 2025	Progres
Obiectivul specific 3.1 Dezvoltarea capacităților naționale de pregătire și instruire în situații de urgență și excepționale	Creșterea graduală a capacităților de pregătire cu 30 p.p.	50%	80%	73%	**Conform planului**
Obiectivul specific 3.2 Valorificarea oportunităților de participare la instruiri/exerciții pe plan internațional	Cel puțin 80% din numărul ofertelor corespunzătoare necesităților de participare valorificate	60%	80%	79,4%	**Conform planului**
Obiectivul specific 3.3 Fortificarea capacităților grupurilor-țintă (*populației, autorităților administrației publice, sectorului privat, asociativ și voluntar*) în gestionarea situațiilor de urgență și excepționale	Cel puțin 10 aplicații tactice comune desfășurate anual	-	30	129	**Devansare**
Obiectivul specific 3.4 Eficientizarea până în anul 2025 a activității de administrare și consolidare a capacității rezervelor de stat și de mobilizare	Creșterea anuală cu cel puțin 8 p.p. a nivelului de completare a rezervelor de stat și de mobilizare începând cu anul 2023	41%	65%	49%	**Întârziere**

Obiectivul specific 4.1 „*Creșterea la finele anului 2025 a condițiilor de muncă de calitate înaltă pentru a stimula creșterea eficienței angajaților din domeniul situațiilor de urgență și excepționale*”, a fost realizat ***conform planului***.

Pe parcursul anului 2022 au fost finalizate lucrările de construcție a două sedii ale unităților de salvatori și pompieri (în continuare - *USP*) din orașul Ștefan Vodă și municipiul Ungheni, care ulterior au devenit operaționale. Lucrările au fost realizate cu sprijinul financiar al Ambasadei Statelor Unite ale Americii.

În anul 2023 a fost construit și operaționalizat Dispeceratul Integrat pentru situații de urgență NORD. Prin această investiție a fost substanțial îmbunătățit procesul de gestionare a situațiilor de urgență pentru toată zona nordică a țării.

În scopul construcției PSP Holercani, pe parcursul anului 2023 a fost elaborat proiectul tehnic, în valoare de 200 mii lei. Decizia de a construi acest post a fost luată pentru a minimaliza timpul de răspuns și intervenție în situații de urgență, precum și pentru a asigura condiții optime de muncă pentru personalul unității. Lucrările de construcție ale postului menționat sunt planificate să fie finalizate în semestrul I al anului 2026.

Pe parcursul anului 2023, au continuat lucrările de construcție a USP Șoldănești și au fost demarate lucrările de construcție a USP Ocnița, USP Dondușeni și USP Căinari.

În anul 2025 au fost finalizate lucrările de construcție și desfășurate ceremoniile oficiale de inaugurare a 4 sedii a unităților de pompieri și salvatori din r. Ocnița, r. Șoldănești, r. Căinari și r. Dondușeni.

Obiectivul specific 4.2 „*Asigurarea la finele anului 2025 a condițiilor conforme normelor pentru toate tipurile de intervenții*", a înregistrat o ***întârziere***.

La 20.01.2023, în or. Tokyo, Japonia, conducerea IGSU al MAI a semnat contractul între Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI din Republica Moldova și compania „Toyota Tsusho Corporation" din Japonia, privind fabricarea și livrarea a 19 autospeciale pentru echipele de salvatori și pompieri. Tehnica, produsă în Japonia, bazată pe șasiu european a fost livrată în Republica Moldova într-un termen de 23 de luni. Astfel, lotul menționat a fost transmis IGSU al MAI, de către reprezentanții companiei „Toyota Tsusho Corporation" la 04.04.2025.

În anul 2023 au fost valorificați 2000000 de lei (100%) alocați pentru dezvoltarea sub-modulului logistic al echipei de căutare-salvare urbană (Urban Search and Rescue, în continuare - *USAR*) Moldova în contextul furnizării serviciilor de asistență internațională în materie de protecție civilă. Ca urmare, capacitățile de funcționare a modulului au fost testate în anul 2023, în timpul misiunii de sprijin a autorităților turcești pentru efectuarea operațiunilor de căutare-salvare urbană în urma cutremurului de pământ, precum și în cadrul exercițiului regional de teren la scară largă TbiEX Georgia 2023.

Imposibilitatea executării integrale a acțiunii a fost determinată de insuficiența resurselor financiare.

Obiectivul specific 4.3 „*Dezvoltarea capacității de furnizare a asistenței internaționale în materie de protecție civilă*", a înregistrat o ***întârziere***.

La modulul USAR, în perioada anilor 2023-2025 au fost realizate:

1. în anul 2023:

- aprobat/actualizat cadrul normativ al modulelor;
- instruiți 11 angajați cu funcții de conducere din cadrul echipei USAR, în perioada 24-28 iulie 2023, cu suportul Fundației „Solidarity Fund PL" în Moldova și Institutul „iHELP" din Republica Polonă. Cursul de instruire privind utilizarea Sistemului de coordonare și management INSARAG „ICSM management tools" și a platformei Virtual OSOCC;
- instruiți 10 angajați cu funcții de conducere din cadrul echipei USAR, în perioada 10-13 octombrie 2023, cu suportul Fundației „Solidarity Fund PL" în Moldova și Institutul „iHELP" din Republica Polonă. Cursul de instruire privind utilizarea Sistemului de coordonare și management INSARAG, funcționalitatea Reception Departure Centre (RDC) și USAR Coordonation Cell (UCC).

Participarea efectivului Modulului de intervenție GFFF-V MD (Ground Forest Fire Fighting Using Vehicles) în perioada 10-21 iunie 2023 la Exercițiul de teren la scară largă „TbiEX Georgia 2023", în orașul Tbilisi, Georgia.

2. în anul 2024:

- prin Ordinul IGSU a fost aprobat Planul de acțiuni pentru anul 2024 în vederea pregătirii echipei de căutare-salvare urbană USAR Moldova către clasificarea externă, în conformitate cu cerințele ghidurilor INSARAG;
- au fost instruiți 12 angajați (componenta management a echipei USAR), activitate desfășurată în cadrul proiectului „Consolidarea capacității grupului de căutare și salvare din Moldova în conformitate cu standardele ONU";
- 30 de angajați a echipei USAR au participat la Atelierul practic „Organizarea operațiunilor de căutare-salvare și îmbunătățirea tehnicilor de salvare";
- 30 de angajați a echipei USAR au participat la programul de instruire de bază pentru căutare-salvare urbană a echipei USAR Moldova, organizat cu suportul Organizației „Turkish Cooperation and Coordination Agency (TIKA)", Turcia;
- 6 angajați au participa la Stagiul de perfecționare în „Managementul acțiunilor de căutare- salvare urbană";
- a fost transmisă solicitarea către IMSPD „Serviciul medical al MAI" pentru identificarea și dispunerea a doi medici chirurgi în cadrul echipei USAR Moldova, precum și pentru analizarea posibilităților de vaccinare a membrilor echipei în vederea desfășurării misiunilor internaționale;
- în perioada 02.10 - 04.10.2024, 1 angajat a participat în cadrul Reuniunii regionale INSARAG Africa-Europa-Orientul Mijlociu 2024, desfășurată în or. București, România;
- în perioada 13.10 - 19.10.2024, 2 angajați au participat la Cursul de coordonare USAR, organizat de Direcția Generală Protecție Civilă și Operațiuni Umanitare Europene (DG ECHO), în localitatea Volterra, Italia.

3. în anul 2025:

În anul 2025, în scopul pregătirii efectivului echipei USAR Moldova, s-a participat la 8 activități de instruire și pregătire, cu instruirea a 71 angajați ai IGSU al MAI și 2 angajați ai IMSPD „Serviciul medical al MAI".

De asemenea, au fost achiziționate 28 de seturi de echipamente pentru debitat beton, în valoare de 2.200.000 de lei.

Pentru operaționalizarea modulului de pompare de mare capacitate (HCP), proces aflat în dezvoltare, dotarea cu echipamente și realizarea integrală a obiectivului nu au fost posibile din cauza insuficienței resurselor financiare.

Obiectivul specific 4.4 „*Sporirea până în anul 2025 a rezilienței la situații care pun în pericol sănătatea oamenilor*", în perioada evaluată ***nu a putut fi evaluat***.

Cu toate că, în perioada anilor 2022-2025 au fost desfășurate 36 intervenții SMURD, indicatorul nu putut fi atins din următoarele cauze:

a) Odată cu implementarea Serviciului Național Unic pentru Apelurile de Urgență 112, serviciul SMURD al IGSU al MAI din motive nedefinite continuă a nu fi implicat în intervențiile comune, cu toate că se regăsește în Indexul de cooperare și intervenție/indexul de caz dintre echipajele de intervenție de urgență ale Ministerului Sănătății și Ministerului Afacerilor Interne;

b) Sistarea totală din anul 2017 a activității echipajelor SMURD din cadrul intervențiilor comune, în deosebi a celor cu Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (CNAMUP);

c) Lipsa funcțiilor de paramedic pentru operaționalizarea echipajelor de prin ajutor calificat SMURD din cadrul IGSU al MAI (stoparea modificării prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 137/2019).

Imposibilitatea înregistrării progresului la obiectivul specific 4.4, este determinată de faptul că echipajele SMURD ale IGSU al MAI, deși dispun de competențe în domeniu, nu sunt integrate în sistemul național de intervenție medicală de urgență în faza prespitalicească. În consecință, acestea nu participă la intervenții medicale prespitalicești și nu sunt implicate în acțiuni comune cu echipajele CNAMUP, situație care a condus la nealocarea misiunilor către aceste echipaje.

Tabelul nr. 8. Gradul de realizare a indicatorilor de rezultat (Obiectivul 4)

Obiectivul specific	Indicator de rezultat al politicii publice	Valoarea de referință (2022)	Ținta care urmează a fi atinsă (2025)	Valoarea înregistrată la finalul anului 2025	Progres
Obiectivul specific 4.1 Creșterea până în anul 2025 a condițiilor de muncă de calitate înaltă pentru a stimula creșterea eficienței angajaților din domeniul situațiilor de urgență și excepționale	12 sedii asigurate cu condiții corespunzătoare de muncă	76	88	92	**Conform planului**
Obiectivul specific 4.2 Asigurarea până în anul 2025 a condițiilor conforme normelor pentru toate tipurile de intervenții	Creșterea cu 10 p.p. a mijloacelor tehnice de intervenție care corespund normelor de dotare	53,5%	63,5%	54,6%	**Întârziere**
Obiectivul specific 4.3 Dezvoltarea capacității de furnizare a asistenței internaționale în materie de protecție civilă	2 module operaționalizate	-	2	1 modul	**Întârziere**
Obiectivul specific 4.4 Sporirea până în anul 2025 a rezilienței la situații care pun în pericol sănătatea oamenilor	Dezvoltarea misiunilor de intervenție atribuite SMURD	0	6000	36 (0,6%)	**Nu poate fi evaluat**

3.3 Constatări privind implementarea acțiunilor și realizarea livrabilelor

Având în vedere faptul că Programul a fost aprobat în noiembrie 2022, rapoartele cu privire la implementarea Programului pentru anul 2022 nu au fost elaborate. La începutul anului 2025, a fost publicat Raportul de evaluare intermediară a Programului pentru anii 2022-2023. Raportul curent reflectă rezultatele înregistrate în anii 2022-2025.

Planul de acțiuni conține 78 indicatori de monitorizare. Din cei 78 de indicatori planificați pentru 2022-2025, 55 de indicatori cu statut **realizat (71%)**, 15 indicatori **în proces (progres avansat) (19%)**, 3 indicatori **nerealizați (4%)** și 5 indicatori care **nu au fost inițiați (6%)**.

Indicatorii de monitorizare stabiliți acțiunilor planificate au înregistrat următoarele progrese:

- din 12 de indicatori de monitorizare stabiliți pentru **Obiectivul general 1**, 7 (58%) au fost *realizați*, 2 (17%) indicatori sunt *în proces* (*progres avansat*), 2 (17%) indicatori *nerealizați* și 1 (8%) indicator *neinițiat*;

- din 24 de indicatori de monitorizare stabiliți pentru **Obiectivul general 2**, 11 (46%) au fost *realizați*, 9 (38%) indicatori sunt *în proces* (*progres avansat*), 1 (4%) indicator *nerealizat* și 3 (13%) indicatori *neinițiați*;
- din 23 de indicatori de monitorizare stabiliți pentru **Obiectivul general 3**, 22 (96%) au fost *realizați* și 1 (4%) indicator *neinițiat*;
- din 19 de indicatori de monitorizare stabiliți pentru **Obiectivul general 4**, 15 (79%) au fost *realizați* iar 4 (21%) indicatori sunt *în proces* (*progres avansat*).

Gradul de realizare a indicatorilor de monitorizare pentru întreaga perioadă de implementare a Programului (2022-2025) este reflectat în Tabelul nr. 9 / Graficul nr. 2.

Tabelul nr. 9. Gradul de realizare a indicatorilor de monitorizare a acțiunilor Programului

Termenul	Nr. indicatorilor	Realizat	În proces (progres avansat)	Nerealizat	Neinițiat	Rata de implementare
2022	**0**	0	0	0	0	0
2023	**9**	6	2	1	0	67%
2024	**11**	6	3	0	2	55%
2025	**58**	43	10	2	3	74%
Total	**78**	**55**	**15**	**3**	**5**	**71%**
Total (%)	**100%**	**71%**	**19%**	**4%**	**6%**	

Graficul nr. 2. Gradul de realizare a indicatorilor de monitorizare a acțiunilor Programului

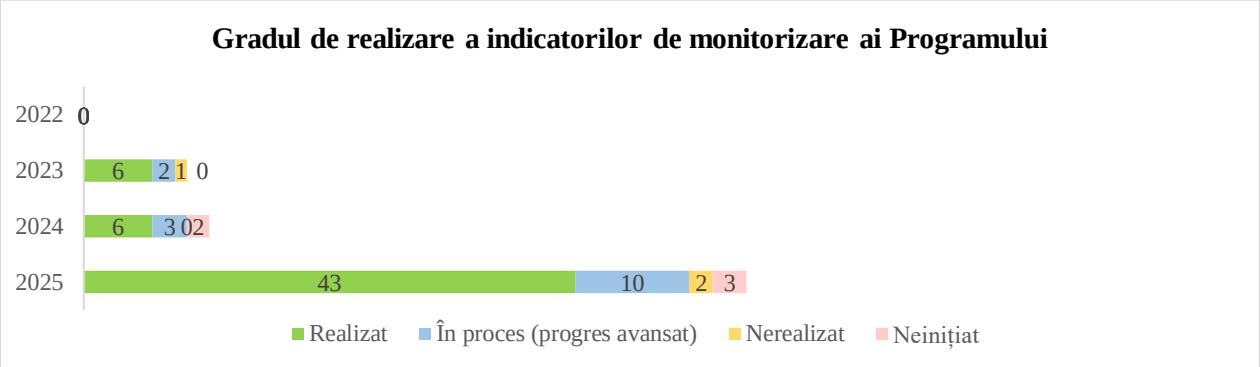

Dacă ne referim la gradul de realizare a **produselor pentru fiecare obiectiv general,** pentru întreaga perioadă (2022-2025) constatăm că gradul de implementare al acțiunilor din **Obiectivului general 1** este următorul: **realizate** 7 produse (58%), 2 produse sunt **în proces de realizare** (17%), 1 produs **nerealizat** (8%) și 2 produse **neinițiate** (17%). Pentru **Obiectivul general 2**, au fost **realizate** 11 produse (46%), 9 produse sunt **în proces de realizare** (38%), 1 produs **nerealizat** (4%), iar 3 produse sunt **neinițiate** (12%). Pentru **Obiectivul general 3**, au fost **realizate** 22 produse (96%), iar 1 produs este **neinițiat** (4%). Pentru **Obiectivul general 4**, au fost **realizate** 15 produse (79%) iar 4 produse sunt **în proces de realizare** (21%).

Graficul nr. 3. Gradul de realizare a produselor distribuite pe Obiective Generale (numeric)

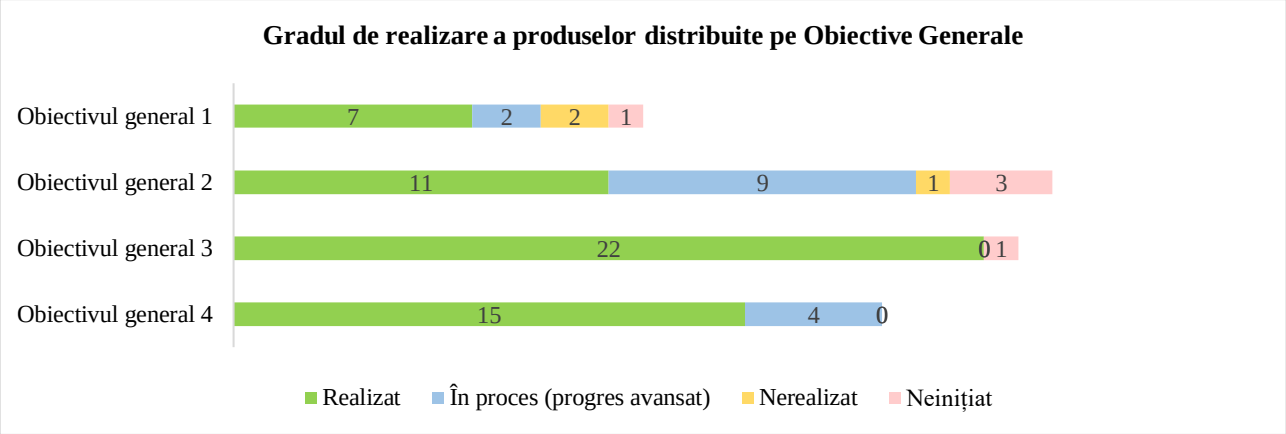

Graficul nr. 4. Gradul de realizare a produselor distribuite pe Obiective Generale (%)

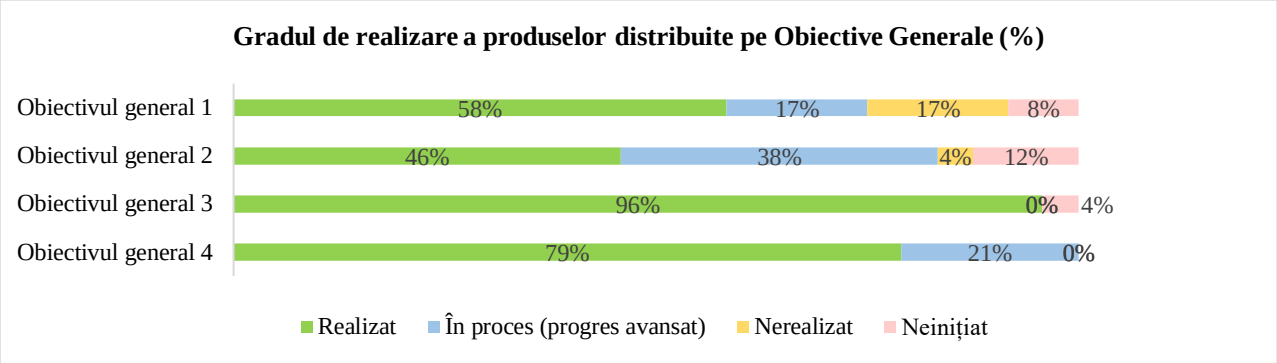

Analiza detaliată a tipurilor de produse livrate (Graficul nr. 5) în perioada 2022-2025 evidențiază o distribuție diversificată a livrabilelor în cadrul Programului. Majoritatea acestora vizează elaborarea, modificarea sau completarea cadrului legislativ și normativ, precum și activități de dotare și echipare. Aceste măsuri au fost esențiale pentru consolidarea capacităților instituționale și întărirea capabilităților operaționale.

În paralel, au fost realizate și alte tipuri de livrabile semnificative, precum campanii și resurse informaționale și tot spectrul de evenimente, reuniuni, instruiri. Acestea au contribuit la mediatizarea acțiunilor necesare de întreprins pentru populație, precum și îmbunătățirea procesului de dezvoltare a angajaților IGSU al MAI, care au avut rolul de a sprijini procesul decizional și de a asigura transparența și claritatea obiectivelor programului.

Mai puțin frecvente, dar totuși importante au fost livrabilele referitoare la dezvoltarea infrastructurii, unde aceste livrabile au fost esențiale pentru susținerea activităților realizate și pentru asigurarea unui cadru adecvat desfășurării acestora.

Graficul nr. 5. Gradul de realizare pe tipuri de produse

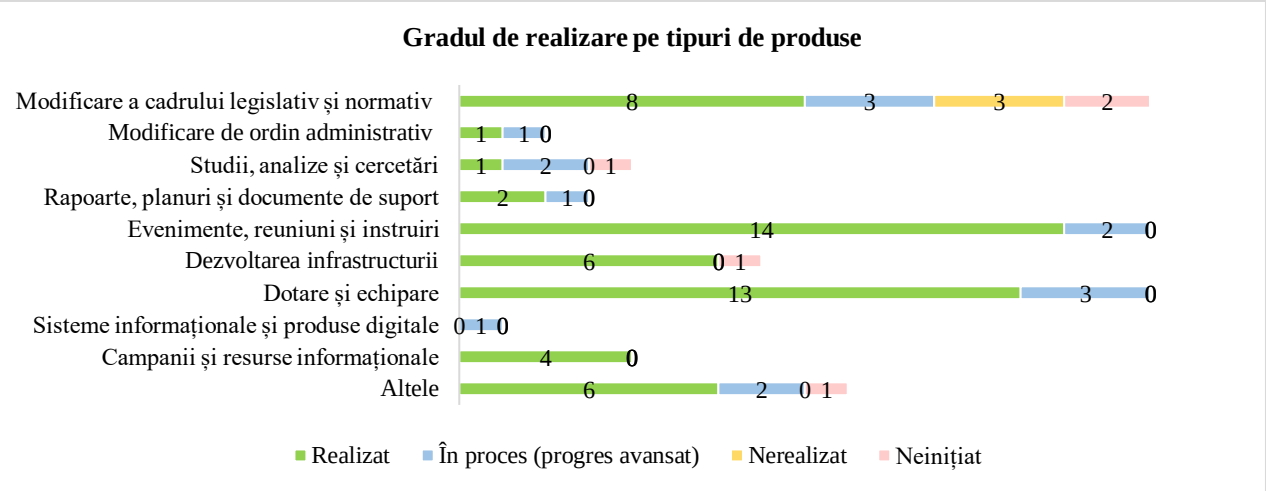

Graficul nr. 6. Gradul de realizare pe tipuri de produse (%)

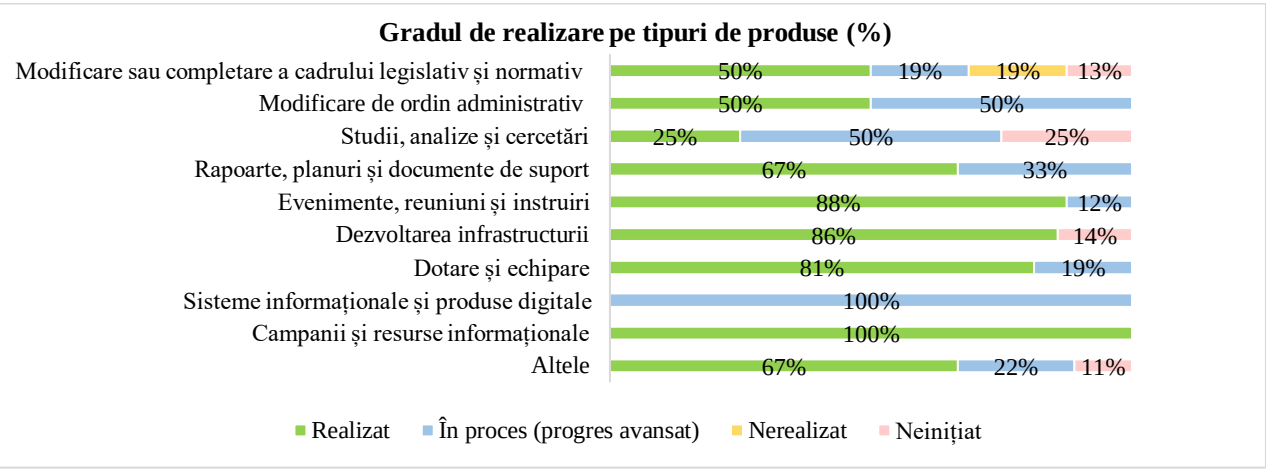

3.3.1 Gradul de realizare a produselor privind Obiectivul general 1

Pentru consolidarea rolului de autoritate în domeniul situațiilor de urgență și excepționale, la etapa de elaborare a programului s-a stabilit necesitatea îmbunătățirii cadrului normativ de reglementare a activității în domeniile prevenirii, pregătirii și răspunsului în situații de urgență și excepționale, care va înlătura lacunele de ordin normativ, astfel eficientizând gestionarea situațiilor de urgență și excepționale. Analiza efectuată a demonstrat o necesitate de a fi elaborate 4 acte normative noi, precum și efectuarea unor modificări la minim 12 acte normative.

În cadrul ***Obiectivului general 1***, *Consolidarea rolului de autoritate în domeniul situațiilor de urgență și excepționale*, analiza gradului de realizare a produselor planificate pentru întreaga perioadă (2022-2025), arată la finalul anului 2025 pentru fiecare obiectiv specific din numărul total de 12 produse, la Obiectivul specific 1.1 - au fost *realizate* 7 produse (58%), 2 produse *în proces* (*progres avansat*) (17%), 2 produse *nerealizate* (17%) și 1 produs *neinițiat* (8%). (Graficele nr. 8 și nr. 9):

Graficul nr. 7. Gradul de realizare a produselor pe obiective specifice (Obiectivul General 1)

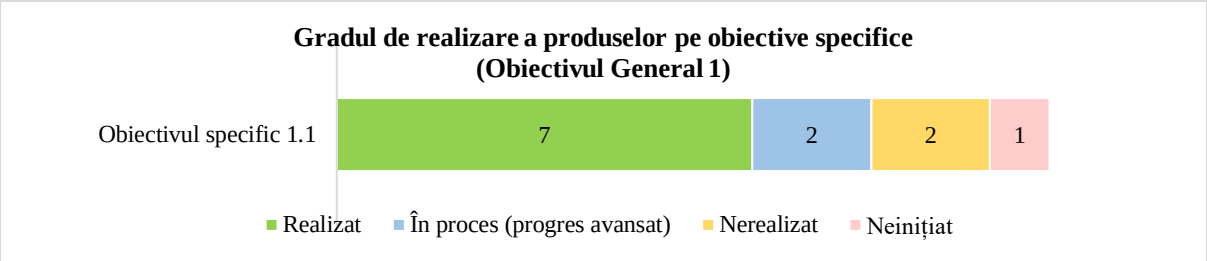

Graficul nr. 8. Gradul de realizare a produselor pe obiective specifice (Obiectivul General 1) (%)

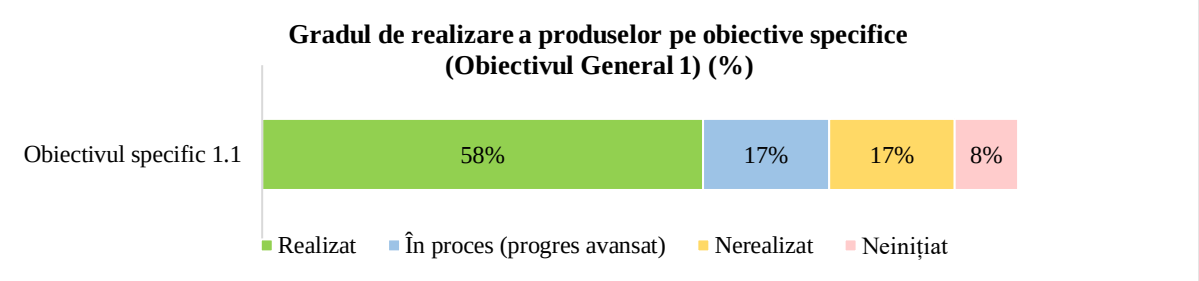

Gradul de realizare a produselor pentru Obiectivul general nr. 1 este redat în tabelul ce urmează:

Tabelul nr. 10. Progresul și gradul de realizare a produselor pentru Obiectivul general 1

Obiectivul specific	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costuri de implementare (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de realizare	Instituție responsabilă și Parteneri	Progres
1.1. Perfecționarea legislației în domeniul situațiilor de urgență și excepționale	1.1.1. Elaborarea proiectului de hotărâre a Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii voluntariatului nr. 121/2010	Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului	În limitele alocațiilor bugetare	Bugetul autorităților implicate	Trimestrul IV, 2023	Ministerul Afacerilor Interne (Direcția politici în domeniul situațiilor de urgență, excepționale și conexe și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență); Ministerul Educației și Cercetării *Parteneri*: Congresul Autorităților Locale din Moldova; Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare - Moldova; „Solidarity Fund PL" în Moldova	**Realizat** Proiectul a fost adoptat în ședința Parlamentului din 24.11.2023, fiind promulgat prin Legea nr. 346/2023.
	1.1.2. Actualizarea integrală a Legii nr. 267/1994 privind apărarea împotriva incendiilor și a Legii nr. 271/1994 cu privire la protecția civilă	Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului	În limitele alocațiilor bugetare	Bugetul autorităților implicate	Trimestrul IV, 2025	Ministerul Afacerilor Interne (Direcția politici în domeniul situațiilor de urgență, excepționale și conexe și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență); Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale	**În proces** **(*progres avansat*)** Proiectul de lege de modificare și completare a Legii nr. 267/1994 privind apărarea împotriva incendiilor, precum și a Legii nr. 271/1994 cu privire la protecția civilă, a fost inițiat și se află în stadiul elaborării întru asigurarea coerenței legislative și conformității cu normele juridice în vigoare, în special cu Legea nr. 248/2025 privind managementul situațiilor de criză.
	1.1.3. Modificarea cadrului normativ referitor la domeniul rețelei naționale de observare și control de laborator asupra contaminării (poluării) mediului înconjurător cu substanțe radioactive, otrăvitoare, puternic toxice și agenți biologici	Hotărâre a Guvernului aprobată	În limitele alocațiilor bugetare	Bugetul autorităților implicate	Trimestrul IV, 2025	Ministerul Afacerilor Interne (Direcția politici în domeniul situațiilor de urgență, excepționale și conexe și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență); Ministerul Mediului; Ministerul Finanțelor	**Realizat** Proiectul hotărârii Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 961/2006 cu privire la aprobarea Regulamentului rețelei naționale de observare și control de laborator asupra contaminării (poluării) mediului înconjurător cu substanțe radioactive, otrăvitoare, puternic toxice și agenți biologici, a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 504/2025.

Obiectivul specific	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costuri de implementare (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de realizare	Instituție responsabilă și Parteneri	Progres
						(Serviciul Vamal); Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare; Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor; Agenția Națională pentru Sănătate Publică; Agenția Proprietății Publice	
	1.1.4. Modificarea Hotărârii Guvernului nr. 282/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind instruirea în domeniul protecției civile	Hotărâre a Guvernului aprobată	În limitele alocațiilor bugetare	Bugetul autorităților implicate	Trimestrul IV, 2025	Ministerul Afacerilor Interne (Direcția politici în domeniul situațiilor de urgență, excepționale și conexe și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență);	**Realizat** Proiectul hotărârii Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 282/2005 pentru aprobarea regulamentului privind instruirea în domeniul protecției civile, a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 749/2025.
	1.1.5. Modificarea Hotărârii Guvernului nr. 862/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea fondurilor de urgență ale Guvernului și a Hotărârii Guvernului nr. 1340/2001 cu privire la Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova	Hotărâre a Guvernului aprobată	În limitele alocațiilor bugetare	Bugetul autorităților implicate	Trimestrul IV, 2025	Ministerul Afacerilor Interne (Direcția politici în domeniul situațiilor de urgență, excepționale și conexe și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență); Ministerul Finanțelor	**Realizat** Au fost aprobate următoarele acte normative: 1. Hotărârea Guvernului nr. 776/2024 pentru modificarea Regulamentului privind gestionarea fondurilor de urgență ale Guvernului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 862/2015, și abrogarea unei hotărâri a Guvernului. 2. Hotărârea Guvernului nr. 19/2024 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1340/2001 cu privire la Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova.
	1.1.6. Elaborarea cadrului normativ pentru reglementarea participării la activități internaționale (misiuni/exerciții)	Hotărâre a Guvernului aprobată	În limitele alocațiilor bugetare	Bugetul autorităților implicate	Trimestrul IV, 2025	Ministerul Afacerilor Interne (Direcția politici în domeniul situațiilor de urgență, excepționale și conexe și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență); Ministerul Afacerilor Externe; Ministerul Finanțelor	**În proces** (***progres avansat***) Prevederile cadrului normativ pentru reglementarea participării la activități internaționale vor fi încorporate în proiectul de lege privind participarea Republicii Moldova la Mecanismul de Protecție Civilă al Uniunii Europene (transpunerea Deciziei 1313/2013 privind Mecanismul de protecție civilă al Uniunii Europene).

Obiectivul specific	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costuri de implementare (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de realizare	Instituție responsabilă și Parteneri	Progres
	1.1.7. Reglementarea procedurilor de transportare a cetățenilor aflați în dificultate în afara țării, inclusiv în dificultate cu caracter medical	Hotărâre a Guvernului aprobată	În limitele alocațiilor bugetare	Bugetul autorităților implicate	Trimestrul IV, 2023	Ministerul Afacerilor Interne (Direcția politici în domeniul situațiilor de urgență, excepționale și conexe și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență)	**Realizat** A fost aprobată Hotărârea Guvernului nr. 675/2023 aprobarea Regulamentului privind procedura de efectuare a misiunilor transfrontaliere cu ambulanțele SMURD.
	1.1.8. Elaborarea și modificarea cadrului normativ pentru reglementarea statutului de paramedic/ recunoașterea studiilor de paramedic	Cadru normativ elaborat și aprobat	În limitele alocațiilor bugetare	Bugetul autorităților implicate	Trimestrul IV, 2023	Ministerul Afacerilor Interne (Direcția politici în domeniul situațiilor de urgență, excepționale și conexe și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență)	**Realizat** A fost emis Ordinul șefului IGSU nr. 297/2023 cu privire la aprobarea Regulamentului de activitate a echipajelor de prim ajutor calificat a Serviciului mobil de urgență reanimare și descarcerare.
	1.1.9. Modificarea Hotărârii Guvernului nr. 137/2019 cu privire la organizarea și funcționarea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență	Hotărâre a Guvernului aprobată; state de personal ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne suplinite (număr de persoane 123[1])	Anul 2023 - 16491,0; anul 2024 - 16491,0; anul 2025 - 16491,0	Bugetul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne	Trimestrul IV, 2023	Ministerul Afacerilor Interne (Direcția politici în domeniul situațiilor de urgență, excepționale și conexe și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență)	**Nerealizat** În prezent, acțiunea privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 137/2019 este prevăzută în Programul național de dezvoltare a protecției civile pentru anii 2026-2030, cu termen de realizare trimestrul IV, 2030.

[1] Pentru perioada 2022-2025 au fost planificate pentru suplinire 123 de funcții strict necesare.

Obiectivul specific	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costuri de implementare (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de realizare	Instituție responsabilă și Parteneri	Progres
	1.1.10. Stabilirea competențelor autorităților publice centrale privind gestionarea situațiilor de urgență și excepționale	Hotărâre a Guvernului aprobată	În limitele alocațiilor bugetare	Bugetul autorităților implicate	Trimestrul IV, 2025	Ministerul Afacerilor Interne (Direcția politici în domeniul situațiilor de urgență, excepționale și conexe și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență); Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale; Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare; Ministerul Mediului; Ministerul Sănătății	**Nerealizat** Urmare intrării în vigoare a Legii nr. 248/2025 privind managementul situațiilor de criză, se impune necesitatea corelării proiectului hotărârii Guvernului cu privire la stabilirea competențelor autorităților publice centrale privind gestionarea situațiilor de urgență și excepționale cu prevederile legale. În acest context, prevederile proiectului se vor regăsi ca parte componentă a Planului național de management al crizelor, document care va reglementa în mod integrat procesul de management al crizelor la nivel național.
	1.1.11. Modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1076/2010 cu privire la clasificarea situațiilor excepționale și la modul de acumulare și prezentare a informațiilor în domeniul protecției populației și teritoriului în caz de situații excepționale	Hotărâre a Guvernului aprobată	În limitele alocațiilor bugetare	Bugetul autorităților implicate	Trimestrul IV, 2025	Ministerul Afacerilor Interne (Direcția politici în domeniul situațiilor de urgență, excepționale și conexe, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență)	**Realizat** A fost aprobată Hotărârea Guvernului nr. 500/2024 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1076/2010 cu privire la clasificarea situațiilor excepționale și la modul de acumulare și prezentare a informațiilor în domeniul protecției populației și teritoriului în caz de situații excepționale.

Obiectivul specific	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costuri de implementare (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de realizare	Instituție responsabilă și Parteneri	Progres
	1.1.12. Modificarea actelor normative privind atribuirea IGSU al MAI a competențelor de constatare a incendiilor	Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului	În limitele alocațiilor bugetare	Bugetul autorităților implicate	Trimestrul IV, 2025	Ministerul Afacerilor Interne (Direcția politici în domeniul situațiilor de urgență, excepționale și conexe, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență); Ministerul Justiției	**Neinițiat**

3.3.2 Gradul de realizare a produselor privind Obiectivul general 2

În perioada 2022-2025, în cadrul Obiectivului General 2, au fost planificate o serie de acțiuni complexe și detaliate, având ca scop implementarea și atingerea rezultatelor vizate de acest obiectiv.

În cadrul **Obiectivului general 2**, *Eficientizarea măsurilor de prevenire a situațiilor de urgență și excepționale*, analiza gradului de realizare a produselor planificați pentru întreaga perioadă (2022-2025), arată la finalul anului 2025, din numărul total de 24 de produse, au fost realizate următoarele măsuri:

Obiectivul specific 2.1 - din 4 produse: a fost *realizat* 1 produs (25%), 2 produse *în proces* (*progres avansat*) (50%) și 1 produs *neinițiat* (25%).

Obiectivul specific 2.2 - din 11 produse: au fost *realizate* 6 produse (55%), 3 produse *în proces* (*progres avansat*) (27%), 1 produs *nerealizat* (9%) și 1 produs *neinițiat* (9%).

Obiectivul specific 2.3 - din 5 produse: au fost *realizate* 4 produse (80%), 1 produs *în proces* (*progres avansat*) (20%).

Obiectivul specific 2.4 - din 4 produse: 3 produse *în proces* (*progres avansat*) (75%) și 1 produs *neinițiat* (25%).

Graficul nr. 9. Gradul de realizare a produselor pe obiective specifice (Obiectivul General 2)

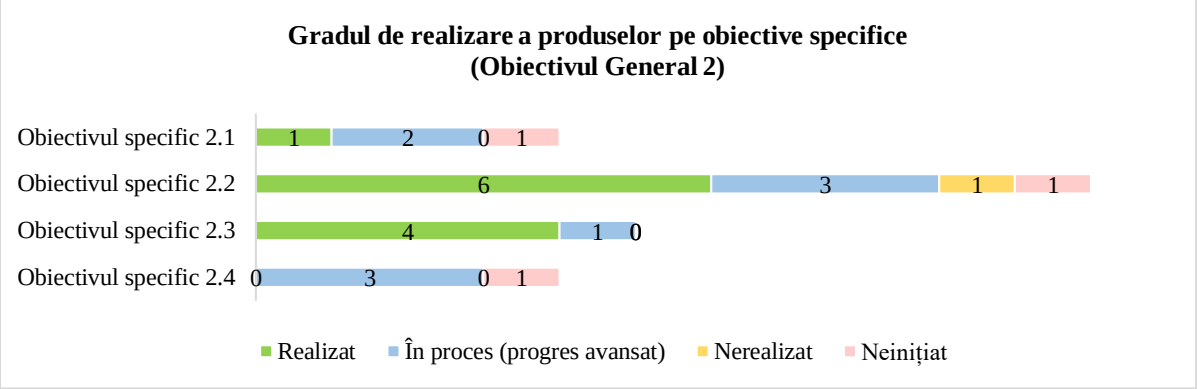

Graficul nr. 10. Gradul de realizare a produselor pe obiective specifice (Obiectivul General 2) (%)

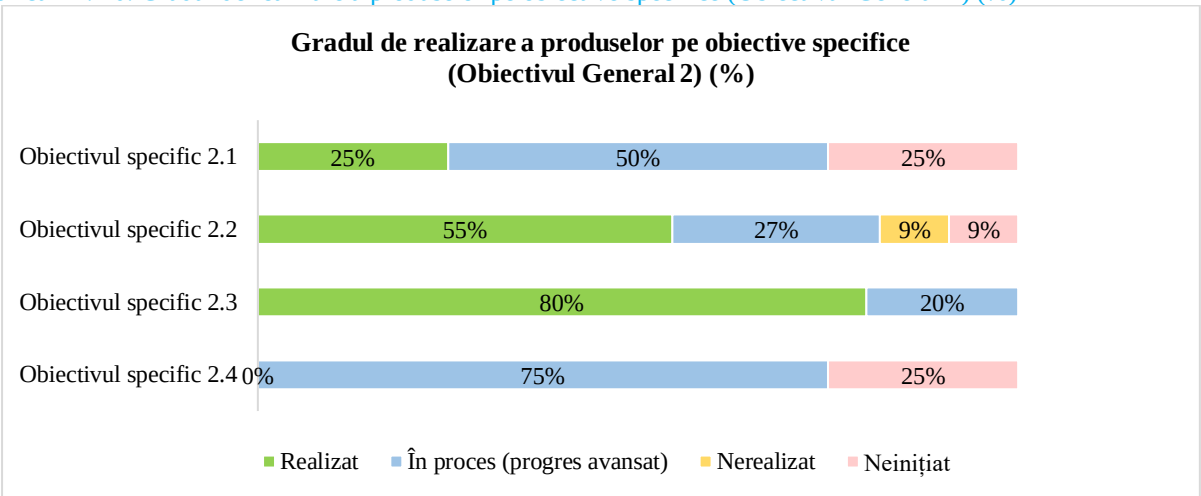

Gradul de realizare a produselor pentru Obiectivul general nr. 2 este redat în tabelul ce urmează:

Tabelul nr. 11. Progresul și gradul de realizare a produselor pentru Obiectivul general 2

Obiectivul specific	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costuri de implementare (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de realizare	Instituție responsabilă și Parteneri	Progres
2.1. Operaționalizarea până în anul 2025 a sistemului național de avertizare timpurie	2.1.1. Elaborarea studiului de fezabilitate a sistemului național de avertizare timpurie	Studiu de fezabilitate și documentație tehnică a sistemului național de avertizare timpurie realizate	2500,0	Bugetul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne	Trimestrul IV, 2023	Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General pentru Situații de Urgență)	**Realizat** Studiul de fezabilitate și documentația conexă pentru implementarea Sistemului de avertizare publică „MD-ALERT” în Republica Moldova, a fost elaborat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență pe parcursul anului 2024 (înregistrat la 20.12.2024, cu nr. 3821). Acesta face parte din cadrul proiectului MD-ALERT-STUDY, finanțat de Uniunea Europeană, (sistem de avertizare similar celor implementate în țările membre ale Uniunii, conform standardelor Uniunii Europene).
	2.1.2. Elaborarea conceptului sistemului național de avertizare timpurie	Hotărâre a Guvernului aprobată	În limitele alocațiilor bugetare	Bugetul autorităților implicate	Trimestrul IV, 2024	Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și Direcția politici în domeniul situațiilor de urgență, excepționale și conexe); Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică; Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației	**Realizat** Proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului de avertizare publică „MD-ALERT” a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 112 din 18 martie 2026.
	2.1.3. Elaborarea Regulamentului de utilizare a sistemului național de avertizare timpurie	Hotărâre a Guvernului aprobată	În limitele alocațiilor bugetare	Bugetul utorităților implicate	Trimestrul IV, 2024	Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și Direcția politici în domeniul situațiilor de urgență, excepționale și conexe); Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică; Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației	**Neinițiat** Odată cu adoptarea proiectului hotărârii Guvernului cu privire la cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului de avertizare publică „MD-ALERT”, va fi elaborat Regulamentul de utilizare a Sistemului de avertizare publică.
	2.1.4. Dezvoltarea sistemului național de avertizare timpurie a populației	Sistem dezvoltat și funcțional	55 000 - bugetul Inspectoratului General	Bugetul Inspectoratului General pentru	Trimestrul IV, 2025	Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General pentru Situații de Urgență,	**În proces** (***progres avansat***) În anul 2025, a fost adoptă Legea nr. 67/2025 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre

Obiectivul specific	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costuri de implementare (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de realizare	Instituție responsabilă și Parteneri	Progres
			pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne; 55 000,0 - surse externe (Uniunea Europeană, NATO, România, Cehia, Franța)	Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne; bugetul autorităților implicate; surse externe		Serviciul Tehnologii Informaționale); Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică; Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației	Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării Proiectului de susținere a managementului riscurilor de dezastre și rezilienței Republicii Moldova. Totodată, au fost efectuate următoarele acțiuni: 1. Desfășurarea consultărilor cu partenerii privind aspecte ce vizează procedura de achiziție, fiind finalizate și documentele tehnice necesare, inclusiv caietul de sarcini și specificațiile tehnice; 2. Definitivarea documentației aferente procedurii de achiziție, în conformitate cu cerințelor Băncii Mondiale (bidding documents), împreună cu experții Băncii Mondiale.
2.2. Consolidarea activității de comunicare și informare preventivă	2.2.1. Desfășurarea campaniilor de informare și prevenire a situațiilor excepționale	Cel puțin 10 campanii de informare preventivă desfășurate	5 000,0	Bugetul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne	Trimestrul IV, 2025	Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General pentru Situații de Urgență)	**Realizat** În perioada anilor 2023-2025 au fost desfășurate următoarele: - în anul 2023 au fost desfășurate 11 campanii de informare și prevenire; - în anul 2024 au fost desfășurate 15 campanii de informare și prevenire; - în anul 2025 au fost desfășurate 12 activități de prevenire conform riscului sezonier și 2 campanii de prevenire.
		Cel puțin 100 000 de persoane informate și 30% de localități acoperite		Bugetul IGSU al MAI	Trimestrul IV, 2025	Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General pentru Situații de Urgență)	**Realizat** În perioada anilor 2023-2025 au fost desfășurate campanii de informare și prevenire, ceea ce a constituit 95% din numărul total de localități: - în anul 2023 au fost informate și instruite 698945 de persoane; - în anul 2024 au fost informate și instruite 811525 de persoane; - în anul 2025 au fost informate și instruite 526812 de persoane, 331742 de copii și 34206 de cadre didactice.

Obiectivul specific	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costuri de implementare (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de realizare	Instituție responsabilă și Parteneri	Progres
		Cel puțin 8 spoturi TV realizate		Bugetul IGSU al MAI	Trimestrul IV, 2025	Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General pentru Situații de Urgență)	**Realizat** În perioada anilor 2023-2024 au fost realizate apariții în mass-media, prin intermediul presei scrise (ziare, reviste), mijloacele audiovizuale (radio, televiziune) și internet (inclusiv rețelele sociale): - în anul 2023 au fost realizate 5 spoturi video și 1797 de apariții în mass-media (ziar, radio, TV); - în anul 2024 au fost efectuate 1055 de apariții în mass-media (ziar, radio, TV); - în anul 2025 au fost efectuate 4215 de apariții în mass-media (ziar, radio, TV).
		Cel puțin 20 de materiale diseminate prin intermediul rețelelor de socializare		Bugetul IGSU al MAI	Trimestrul IV, 2025	Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General pentru Situații de Urgență)	**Realizat** În perioada anilor 2023-2025 au fost efectuate următoarele acțiuni: - în anul 2023 au fost plasate pe rețelele de socializare 35 de materiale informative și de prevenție și au fost distribuite 375456 de pliante și materiale informative; - în anul 2024 au fost plasate pe rețelele de socializare 35 de materiale informative și de prevenție și au fost distribuite 382723 de pliante și materiale informative; - în anul 2025 au fost plasate pe rețelele de socializare 56 materiale informative și de prevenție.
		Cel puțin 4 echipamente tipografice procurate		Bugetul IGSU al MAI	Trimestrul IV, 2025	Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General pentru Situații de Urgență)	**Realizat** În anul 2023, în cadrul Proiectului „*Donare de echipament pentru Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și instruire în domeniul comunicării pe timp de criză*” a fost donat un lot de echipament tehnic necesar acțiunilor de prevenire și comunicare cu publicul (imprimante pentru pliante informative, laptop, camere de filmat și fotografiat, tabletă, dar și alte accesorii tehnice) în valoare totală de circa 400 de mii de lei MDL.

Obiectivul specific	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costuri de implementare (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de realizare	Instituție responsabilă și Parteneri	Progres
							Proiectul a fost implementat de Organizația Nonguvernamentală Transparency International-Moldova, fiind finanțat de Ambasada SUA în Republica Moldova. În anul 2024 Consiliul Central Danez pentru Refugiați a donat Inspectoratului 4 laptopuri pentru activitățile de prevenire.
	2.2.2. Elaborarea conceptului de organizare a activității de prevenție	Concept de organizare a activității de prevenire elaborat și aprobat (ordin al ministrului afacerilor interne aprobat)	În limitele alocațiilor bugetare	Bugetul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne	Trimestrul IV, 2023	Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General pentru Situații de Urgență)	**În proces** **(*progres avansat*)** Proiectul de ordin al MAI privind Conceptul de organizare a activității de prevenție a fost avizat pe intern cu Direcția juridică și Inspectoratul de Management Operațional al MAI. Urmare adoptării Legii nr. 248/2025 privind managementul situațiilor de criză, legislația în domeniul gestionării situațiilor de urgență și excepționale a suferit modificări substanțiale, iar Conceptul menționat urmează a fi ajustat în conformitate cu prevederile acesteia.
	2.2.3. Crearea etapizată și operaționalizarea modulelor regionale mobile de prevenire	3 module mobile de prevenire operaționale	3 300,0 - bugetul IGSU al MAI; 3 300,0 - negocieri, asistență externă (Uniunea Europeană)	Bugetul IGSU al MAI; surse externe	Trimestrul IV, 2025	Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General pentru Situații de Urgență)	**Realizat parțial** În anul 2025 au fost create și operaționalizate două module regionale mobile, amplasate în cadrul Direcției Situații Excepționale a municipiului Chișinău și în cadrul Direcției Situații Excepționale a municipiului Bălți.

Obiectivul specific	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costuri de implementare (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de realizare	Instituție responsabilă și Parteneri	Progres
	2.2.4. Elaborarea metodologiei naționale de evaluare a riscurilor situațiilor de urgență/excepționale	Hotărâre a Guvernului aprobată	În limitele alocațiilor bugetare; negociere/asistență externă	Bugetul autorităților implicate; surse externe	Trimestrul IV, 2025	Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General pentru Situații de Urgență); Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale	**Nerealizat** În urma ședinței organizate de către Cancelaria de Stat la 10.09.2025, cu participarea reprezentanților Președinției, MAI, Ministerului Apărării și a experților în domeniu, s-a decis integrarea Metodologiei naționale de evaluare a riscurilor de dezastre ca parte componentă a Metodologiei de elaborare a evaluării naționale de risc, elaborată de Centrului Național de Management al Crizelor, care urmează a fi aprobată prin hotărâre de Guvern, în conformitate cu prevederile Legii nr. 248/2025 privind managementul situațiilor de criză.
		Metodologia existentă la nivel local revizuită	În limitele alocațiilor bugetare	Bugetul autorităților implicate	Trimestrul IV, 2024	Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General pentru Situații de Urgență); Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale	**Neinițiat**
		Analiza riscurilor la nivel central și local efectuată	În limitele alocațiilor bugetare; negociere/asistență externă	Bugetul autorităților implicate; surse externe	Trimestrul IV, 2025	Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General pentru Situații de Urgență); Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică)	**În proces** **(*progres avansat*)** În anul 2025, realizarea acțiunii a demarat prin proiectul „Sprijinirea îmbunătățirii capacității de pregătire și răspuns în situații de urgență a Moldovei, inclusiv prin dezvoltarea metodologiei pentru procesul de evaluare a riscurilor și cartografierea riscurilor de dezastru” („Supporting the improvement of Moldova's Emergency preparedness and Response capacity, including through the Development of the Methodology for the Risk Assessment process and Disaster Risk Mapping”), care va dura până în anul 2026.

Obiectivul specific	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costuri de implementare (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de realizare	Instituție responsabilă și Parteneri	Progres
	2.2.5. Instruirea copiilor/elevilor în instituțiile de învățământ privind situațiile de risc (riscurile situațiilor de urgență/excepționale)	Ore obligatorii privind cunoștințe de bază de prevenire a riscurilor și comportament sigur în situații de urgență și excepționale introduse în curriculumul școlar	În limitele alocațiilor bugetare	Bugetul autorităților implicate	Trimestrul IV, 2024	Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General pentru Situații de Urgență); Ministerul Educației și Cercetării	**În proces (*progres avansat*)** În anul 2023 au fost desfășurate 6 activități de instruire, la care au participa 905 de copii și 83 de maturi. Totodată, în cadrul Centrului republican de instruire al IGSU al MAI au fost instruite 189 de cadre didactice și 526 de copii (elevi și studenți) din cadrul a 12 instituții de învățământ. În anul 2024 au fost desfășurate ore de instruire, la care au participat 436.802 copii (copii, elevi, studenți), 39.867 de cadre didactice, precum și 18 persoane din rândul personalului auxiliar, din cadrul a 2.232 instituții de învățământ (instituții preșcolare, colare și preuniversitare).
2.3. Sporirea până în anul 2025 a gradului de integrare și implicare a voluntariatului în viața comunității	2.3.1. Elaborarea conceptului privind activitatea de voluntariat în domeniul prevenirii și gestionării situațiilor de urgență și excepționale	Concept de dezvoltare a voluntariatului elaborat	În limitele alocațiilor bugetare	Bugetul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne	Trimestrul IV, 2023	Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General pentru Situații de Urgență) *Parteneri*: Congresul Autorităților Locale din Moldova, Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare - Moldova; „Solidarity Fund PL" în Moldova	**În proces (*progres avansat*)** La 24.11.2023, a fost aprobată Legea nr. 346 pentru modificarea Legii voluntariatului nr.121/2010. Drept rezultat al ultimelor modificări la Legea menționată, a apărut necesitatea de a elabora o nouă Lege privind voluntariatul în domeniul protecției civile și apărării împotriva incendiilor. Proiectul de lege privind voluntariatul în domeniul protecției civile și apărării împotriva incendiilor a fost elaborat și ajustat cu noi actualizări și a fost înaintat Direcției juridice pentru expunere.
	2.3.2. Cooperarea cu organele administrațiilor publice centrale, locale, sectorul privat și asociativ în scopul dezvoltării voluntariatului în domeniu	Acorduri de cooperare cu autoritățile publice locale, sectorul privat și asociativ încheiate	În limitele alocațiilor bugetare	Bugetul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al Ministerului	Trimestrul IV, 2025	Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General pentru Situații de Urgență)	**Realizat** În anul 2023 au fost încheiate 6 acorduri de parteneriat dintre APL și IGSU al MAI. În anul 2024 au fost semnate 3 acorduri de cooperare cu APL. În anul 2025 au fost semnate 2 Acordului de parteneriat între IGSU al MAI și APL privind

Obiectivul specific	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costuri de implementare (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de realizare	Instituție responsabilă și Parteneri	Progres
				Afacerilor Interne			organizarea și funcționarea Posturilor voluntare de salvatori și pompieri.
	2.3.3. Înființarea structurilor de salvatori și pompieri voluntari	Cel puțin 7 posturi de salvatori pompieri voluntari create; personal voluntar identificat și recrutat (70 de persoane)	În limitele alocațiilor bugetare; negociere/asistență externă	Bugetul autorităților implicate; surse externe	Trimestrul IV, 2025	Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General pentru Situații de Urgență) *Parteneri*: Congresul Autorităților Locale din Moldova; autoritățile publice locale	**Realizat** În anul 2023 au fost instituite Posturile teritoriale de salvatori și pompieri în s. Etulia, UTA Găgăuzia și s. Căpriana, r. Strășeni, cu instruirea a 2 angajați civili și a 11 voluntari. În anul 2024 a fost redeschis Postul de salvatori și pompieri din s. Sireți (r. Strășeni). În anul 2025 au fost inaugurate Posturi teritoriale de salvatori și pompieri în s. Zubrești și s. Scoreni (r. Strășeni).
	2.3.4. Dotarea cu autospeciale a posturilor de voluntari	Posturile de voluntari dotate cu autospeciale din contul donațiilor (7 autospeciale)	În limitele alocațiilor bugetare; negociere/asistență externă/donații	Bugetul autorităților implicate; surse externe; donații	Trimestrul IV, 2025	Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General pentru Situații de Urgență) *Parteneri:* autoritățile publice locale	**Realizat** În anul 2022, prin contracte de comodat, IGSU al MAI au fost transmise în folosință temporară, cu titlu gratuit, 4 autospeciale de intervenție către PSP, iar în anul 2023 de către Asociația pompierilor voluntari din Republica Austria au fost donate 3 autospeciale pentru operaționalizarea viitoarelor PSP. În anul 2024 au fost transmise 9 autospeciale, iar în anul 2025 au fost recepționate și distribuite, pentru dotarea posturilor de voluntari, 9 autospeciale de intervenție, destinate posturilor.
	2.3.5. Instruirea personalului voluntar	Cel puțin 250 de voluntari instruiți	În limitele alocațiilor bugetare	Bugetul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne	Trimestrul IV, 2025	Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General pentru Situații de Urgență)	**Realizat** În anul 2023, în comun cu „Solidarity Fund PL” în Moldova, au fost instruiți 10 formatori din cadrul IGSU al MAI întru implementarea și dezvoltarea voluntariatului în situații de urgență și instruirea a 72 de salvatori și pompieri din cadrul posturilor teritoriale. În anul 2024, în comun cu „Solidarity Fund PL” în Moldova, au fost instruiți 41 de pompieri voluntari. În anul 2025 au fost instruiți 95 de pompieri voluntari.

Obiectivul specific	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costuri de implementare (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de realizare	Instituție responsabilă și Parteneri	Progres
2.4. Creșterea calității procesului instituțional de expertiză în prevenirea situațiilor de urgență și excepționale	2.4.1. Dotarea laboratoarelor IGSU al MAI cu instalații, utilaj și echipamente	Echipamente, instalații și utilaje pentru activitatea de expertiză procurate (un set)	2 500,0 - bugetul IGSU al MAI; 2 500,0 - asistență externă (Uniunea Europeană)	Bugetul IGSU al MAI; surse externe	Trimestrul IV, 2025	Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General pentru Situații de Urgență)	**În proces (*progres avansat*)** În anul 2023, Laboratorul chimic-radiometric al IGSU al MAI, a fost dotat cu echipament de laborator și de mentenanță.
	2.4.2. Instruirea angajaților în domeniul cercetării cazurilor situațiilor de urgență și excepționale, precum și în domeniul stabilirii indicilor tehnici ai materialelor și elementelor de construcție	Personal profesionist instruit (5 persoane/ specialiști)	500,0 - bugetul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne; 500,0 - asistență externă (Uniunea Europeană)	Bugetul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne; surse externe	Trimestrul IV, 2025	Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General pentru Situații de Urgență)	**În proces (*progres avansat*)** În anul 2023, în vederea asigurării continuității în procesul de dezvoltare a capacităților profesionale 2 angajați ai IGSU al MAI au participat la cursul de instruire „Operațiuni în caz de accidente chimice, biologice, radiologice și nucleare (CBRN) - exploatare și mentenanță echipament”. În anul 2025, 2 angajați din cadrul IGSU al MAI au participat la cursurile de perfecționare în vederea certificării în calitate de specialiști categoria III în domeniul „Măsuri de asigurare a securității contra incendiilor”.
	2.4.3. Acreditarea laboratoarelor Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne	Corespunderea cu cel puțin 3 standarde de calitate ISO	30,0 - bugetul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne; 70,0 - asistență externă (Uniunea Europeană)	Bugetul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne; surse externe	Trimestrul IV, 2025	Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General pentru Situații de Urgență)	**În proces (*progres avansat*)** În anul 2024 a fost elaborat parțial Manualul calității, în conformitate cu cerințele standardului SM EN ISO/IEC 17025:2018 și Ghidul ILAC-G19:08/2014. În anul 2025 au fost examinate și studiate cerințele generale pentru competența laboratoarelor de încercări și etalonări conform standardului SM EN ISO/IEC 17025:2018.

Obiectivul specific	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costuri de implementare (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de realizare	Instituție responsabilă și Parteneri	Progres
		Laboratoare ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne acreditate (act de acreditare)	În limitele alocațiilor bugetare	Bugetul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne	Trimestrul IV, 2025	Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General pentru Situații de Urgență)	**Neinițiat**

3.3.3 Gradul de realizare a produselor privind Obiectivul general 3

În cadrul **Obiectivului general 3**, *Modernizarea sistemului național de pregătire pentru situații de urgență și excepționale*, analiza gradului de realizare a produselor planificate pentru întreaga perioadă (2022-2025), arată că la finalul anului 2025, din numărul total de 23 de produse, au fost realizate următoarele măsuri:

Obiectivul specific 3.1 - au fost *realizate* 6 produse (100%).

Obiectivul specific 3.2 - au fost *realizate* 5 produse (100%).

Obiectivul specific 3.3 - au fost *realizate* 4 produse (100%).

Obiectivul specific 3.4 - au fost *realizate* 7 produse (87%) și 1 produs *neinițiat* (13%).

Graficul nr. 11. Gradul de realizare a produselor pe obiective specifice (Obiectivul General 3)

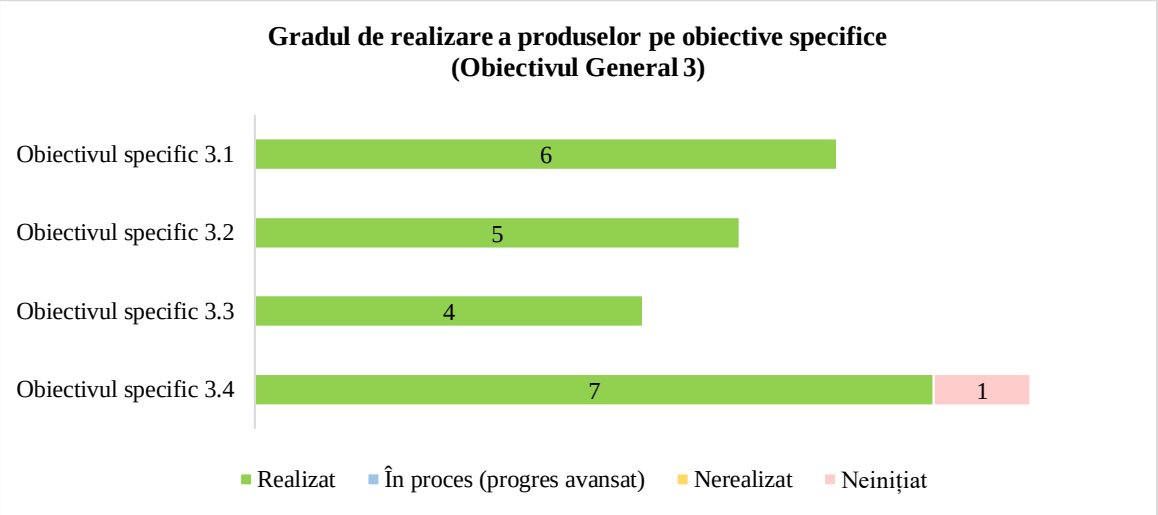

Graficul nr. 12. Gradul de realizare a produselor pe obiective specifice (Obiectivul General 3) (%)

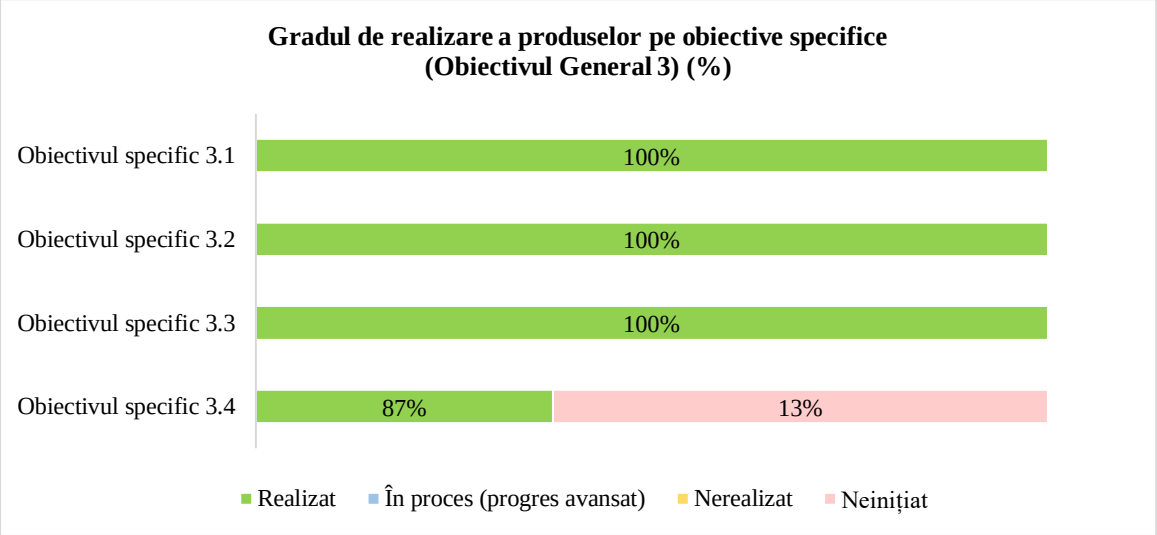

Gradul de realizare a produselor pentru Obiectivul general nr. 3 este redat în tabelul ce urmează:

Tabelul nr. 12. Progresul și gradul de realizare a produselor pentru Obiectivul general 3

Obiectivul specific	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costuri de implementare (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de realizare	Instituție responsabilă și Parteneri	Progres
3.1. Dezvoltarea capacităților naționale de pregătire și instruire în situații de urgență și excepționale	3.1.1. Efectuarea lucrărilor de reconstrucție a clădirii Centrului de instruire al IGSU al MAI din satul Răzeni, raionul Ialoveni	Clădirea Centrului de instruire din satul Răzeni reconstruită/ renovată	Anii 2022-2024: 8 855,3 - bugetul IGSU al MAI; 19 677,2 - surse externe/grant (Uniunea Europeană)	Bugetul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne; surse externe	Trimestrul IV, 2025	Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General pentru Situații de Urgență)	**Realizat** În anul 2022 au fost finalizate lucrările de reconstrucție a unui bloc de studii din gestiunea Centrului republican de instruire al IGSU al MAI din com. Răzeni, r. Ialoveni. În anul 2023 au fost efectuate lucrări de renovare interioară și exterioară a blocului administrativ al Centrului republican de instruire al IGSU al MAI din com. Răzeni, r. Ialoveni, cu ulterioara inaugurare oficială a sediului.
	3.1.2. Înființarea, dotarea și amenajarea poligoanelor de instruire	Poligoane de instruire amenajate (3 poligoane /module)	28 000,0 - bugetul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne; 52 000,0 - asistență externă (Uniunea Europeană, NATO, România)	Bugetul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne; surse externe	Trimestrul IV, 2025	Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General pentru Situații de Urgență)	**Realizat** În perioada 2022-2023 au fost realizate următoarele: 1. a fost creat complexul multifuncțional de pregătire a salvatorilor și salvatorilor „Modul multi-container pentru operațiuni de salvare” (proiectul moldo-polonez „Suport pentru Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova”). 2. a fost creat și dotat Modulul de instruire în domeniul acordării primului ajutor, în cadrul proiectului „Îmbunătățirea timpului de reacție pentru situații de urgență în zona transfrontalieră prin renovarea infrastructurii pentru instruirea populației” (proiectul 2SOFT/45/85). 3. a fost creat modulul de instruire „Gestionarea și răspunsul la dezastre”, destinat factorilor de decizie la nivel local, privind gestionarea și răspunsul în situații de urgență. 4. a fost creat Modulul de instruire privind comunicațiile în standardul TETRA, în cadrul proiectului „Îmbunătățarea capacităților de comunicare bazate pe TIC în zona transfrontalieră de Nord-Est România-Republica Moldova” (proiectul 1HARD/3.1/95/1).

Obiectivul specific	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costuri de implementare (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de realizare	Instituție responsabilă și Parteneri	Progres
							În anul 2024 a fost amenajat modulul de instruire „Stingerea incendiilor de vegetație”, destinat instruirii salvatorilor și pompierilor în domeniul intervențiilor la incendii forestiere. Instruirea fiind organizată la nivel de clasă, cu ajutorul a două simulatoare (rezervoare cu nisip, dotate cu diverse echipamente didactice). În anul 2025, Centrul republican de instruire al IGSU al MAI a fost dotat cu modulul de instruire machetă auto de instruire pentru efectuarea lucrărilor de salvare la accidente rutiere (proiectul polonez „Sprijin pentru Inspectoratul General pentru Situații de Urgență”, etapa a III-a).
		Echipamente și utilaje de pregătire procurate (3 seturi)	1 600,0 - bugetul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne; 14 400,0 - negocieri, asistență externă (Uniunea Europeană, România)	Bugetul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne; surse externe	Trimestrul IV, 2025	Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General pentru Situații de Urgență)	**Realizat** În perioada 2022-2023 au fost achiziționate și/sau donate 3 seturi de echipamente, după cum urmează: a) materiale medicale și manechine pentru instruirea în domeniul primului ajutor; b) echipament special (echipamente de descarcerare, echipamente de alpinism, costume de luptă de diverse tipuri, stații radio, troliu), necesar pentru desfășurarea activităților de instruire în complexul multifuncțional; c) echipament de instruire privind comunicațiile în standard TETRA (calculatoare, stații TETRA mobile și portabile, soft de instruire, videoproiectoare, imprimante, table interactive, etc.). În anul 2025 au fost achiziționate și/sau donate 3 seturi de echipamente, după cum urmează: a) materiale medicale și manechine pentru instruirea în domeniul primului ajutor; b) echipament special (echipamente de descarcerare, echipamente de alpinism, costume de luptă de diverse tipuri, stații radio, troliu), necesar pentru desfășurarea activităților de instruire în complexul multifuncțional;

Obiectivul specific	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costuri de implementare (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de realizare	Instituție responsabilă și Parteneri	Progres
							c) echipament de instruire privind comunicațiile în standard TETRA (calculatoare, stații TETRA mobile și portabile, soft de instruire, imprimante, videoproiectoare, tablă interactivă etc.).
	3.1.3. Elaborarea programelor de instruire și a curricula de studii	Cel puțin 12 programe modulare de pregătire și instruire în situații de urgență elaborate	În limitele alocațiilor bugetare	Bugetul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne	Trimestrul IV, 2025	Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General pentru Situații de Urgență)	**Realizat** În perioada 2022-2023 au fost elaborate și aprobate: 1. Curriculum de instruire în domeniul protecției civile a conducătorilor autorităților locale (proiectul 2SOFT/4.2/71 - „Creșterea protecției populației în situațiile de urgență cauzate de dezastre naturale în zona transfrontalieră”); 2. Curriculum „Stagiu de instruire privind comunicațiile în standardul TETRA pentru personalul IGSU al MAI” (în cadrul proiectului „Îmbunătățarea capacităților de comunicare bazate pe TIC în zona transfrontalieră de Nord-Est România-Republica Moldova”); 3. Curriculum „Formarea inițială a personalului serviciului teritorial de salvatori și pompieri” (în cadrul proiectului „Consolidarea sistemului de protecție civilă în Republica Moldova”, cu suportul „Solidarity Fund PL” în Moldova); În anul 2024, au fost elaborate și aprobate următoarele programe de instruire: 1. Efectuarea lucrărilor de intervenție în situații de urgență; 2. Instruirea comandanților de intervenție; 3. Instruirea conducătorilor auto pentru executarea lucrărilor cu autocisterne de intervenție; 4. Prevenirea situațiilor de urgență și a incendiilor; 5. Conlucrarea cu serviciile de urgență; 6. Acordarea primului ajutor.

Obiectivul specific	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costuri de implementare (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de realizare	Instituție responsabilă și Parteneri	Progres
							În anul 2025, programele de instruire menționate (elaborate în 2024) au fost aprobare de către șeful IGSU. Au fost elaborate și aprobate următoarele tipuri de curriculum, după cum urmează: 1. curriculum de instruire în domeniul protecției civile a conducătorilor autorităților locale (proiectul 2SOFT/4.2/71 - „Creșterea protecției populației în situațiile de urgență cauzate de dezastre naturale în zona transfrontalieră”); 2. curriculum „Stagiu de instruire privind comunicațiile în standardul TETRA pentru personalul IGSU al MAI” (proiect 1HARD/3.1/95/1 - „Îmbunătățarea capacităților de comunicare bazate pe TIC în zona transfrontalieră de Nord-Est România-Republica Moldova”); 3. curriculum „Formarea inițială a personalului serviciului teritorial de salvatori și pompieri”, în cadrul proiectului „Consolidarea sistemului de protecție civilă în Republica Moldova”, cu suportul „Solidarity Fund PL” în Moldova; 4. curriculum „Instruirea conducătorilor auto pentru executarea lucrărilor cu autocisterne de intervenție”; 5. curriculum „Instruirea conducătorilor auto pentru executarea lucrărilor cu autoscările. Totodată, au fost actualizate alte 14 curriculumuri: - în domeniul Protecției Civile a primarilor și vice-primarilor localităților; - în domeniul protecției civile în vederea acțiunilor în situații excepționale a Conducerii Organelor Administrației Publice Locale, Serviciilor Protecției Civile și Unităților Economice; - în domeniul protecției civile a corpului didactic al instituțiilor de învățământ;

Obiectivul specific	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costuri de implementare (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de realizare	Instituție responsabilă și Parteneri	Progres
							- în domeniul Protecției Civile a deținătorilor de lacuri/iazuri; - în domeniul Protecției Civile a șefilor taberelor de odihnă; - în domeniul Protecției Civile a reprezentanților instituțiilor mass-media teritoriale; - în domeniul protecției civile a reprezentanților Agențiilor teritoriale de Asistență Socială; - în domeniul Protecției Civile a comandanților punctelor de aprovizionare cu hrană; - în domeniul Protecției Civile a comandanților echipelor sanitare; - în domeniul Protecției Civile a comandanților formațiunilor de transmisiuni; - în domeniul Protecției Civile a comandanților formațiunilor de mecanizare; - în domeniul Protecției Civile a echipelor de stingere a incendiilor; - în domeniul Protecției Civile a comandanților echipelor de cercetare și observare; - în domeniul Protecției Civile a comandanților formațiunilor de menținere a ordinii publice. Totodată, au fost elaborate 2 curriculumuri noi de instruire a efectivului IGSU al MAI (conducători auto), precum și au fost revizuite și actualizate alte 14 curriculumuri destinate instruirii în domeniul protecției civile.
	3.1.4. Planificarea și desfășurarea sesiunilor de instruire a personalului de specialitate din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne	Cel puțin 300 de angajați din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al	Anul 2023 - 1 000,0; anul 2024 - 1 000,0; anul 2025 - 1 000,0	Bugetul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al Ministerului	Trimestrul IV, 2025	Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General pentru Situații de Urgență)	**Realizat** În anul 2023 au fost instruiți 771 de angajați din cadrul IGSU al MAI. În anul 2024 au fost desfășurate 103 cursuri, în cadrul căruia au fost instruiți 889 de angajați din cadrul IGSU al MAI.

Obiectivul specific	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costuri de implementare (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de realizare	Instituție responsabilă și Parteneri	Progres
		Ministerului Afacerilor Interne instruiți		Afacerilor Interne			În anul 2025 au fost instruiți 635 de angajați.
	3.1.5. Instruirea angajaților și populației pentru acordarea primului ajutor calificat	Cel puțin 60 de angajați și 200 de persoane instruite pentru acordarea primului ajutor calificat	Anul 2023 - 1 000,0; anul 2024 - 1 000,0; anul 2025 - 1 000,0	Bugetul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne	Trimestrul IV, 2025	Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General pentru Situații de Urgență)	**Realizat** În anul 2023 au fost desfășurate instruiri în domeniul acordării primului ajutor calificat pentru 769 de persoane și 13 angajați ai IGSU al MAI. În anul 2024 au fost instruite 843 de persoane, 542 de elevi și 40 de cadre didactice. În anul 2025 au fost desfășurate instruiri pentru 2426 de persoane și 24 de angajați ai IGSU al MAI. Totodată, 30 de angajați ai IGSU al MAI au fost instruiți în cadrul cursului de formare continuă „Acordarea primului ajutor medical”, organizat de Societatea de Cruce Roșie din Moldova.
3.2. Valorificarea oportunităților de participare la instruiri/exerciții pe plan internațional	3.2.1. Participarea angajaților Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne în cadrul Programului de instruire al Mecanismului de Protecție Civilă al Uniunii Europene	Participarea la cel puțin 2 cursuri anual	În limitele alocațiilor bugetare, surse externe	Bugetul IGSU al MAI; surse externe (Programul de instruire al Mecanismului de Protecție Civilă al Uniunii Europene)	Trimestrul IV, 2025	Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General pentru Situații de Urgență)	**Realizat** În anul 2023, în cadrul a 3 cursuri de instruire, au fost instruiți 6 angajați ai IGSU al MAI. În anul 2024, în cadrul a 14 cursuri desfășurate în programul de instruire al mecanismului Protecției Civile al Uniunii Europene, au fost instruiți 12 angajați ai IGSU al MAI. În anul 2025, în cadrul a 14 cursuri desfășurate în programul de instruire al mecanismului Protecției Civile al Uniunii Europene, au fost instruiți 35 angajați ai IGSU al MAI.
		Numărul exercițiilor de teren la care s-a participat		Bugetul IGSU al MAI; surse externe (Programul de instruire al Mecanismului de Protecție Civilă al Uniunii Europene)	Trimestrul IV, 2025	Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General pentru Situații de Urgență)	**Realizat** În anul 2023, 112 angajați ai IGSU al MAI au participat la 6 exerciții internaționale, teoretice (TTX) și practice (FSX), desfășurate în Georgia, Norvegia, Polonia și România. În anul 2024, 7 angajați ai IGSU al MAI au participat la 5 exerciții internaționale desfășurate în Republica Moldova, SUA, Bulgaria, Germania și Austria.

Obiectivul specific	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costuri de implementare (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de realizare	Instituție responsabilă și Parteneri	Progres
							În anul 2025, 267 angajați ai IGSU al MAI au participat la 7 exerciții internaționale desfășurate în Polonia, Bulgaria, Letonia și Turcia.
		Cel puțin 8 angajați instruiți		Bugetul IGSU al MAI; surse externe (Programul de instruire al Mecanismului de Protecție Civilă al Uniunii Europene)	Trimestrul IV, 2025	Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General pentru Situații de Urgență)	**Realizat** În anul 2023, 6 angajați ai IGSU al MAI au fost instruiți în cadrul a 3 cursuri. În anul 2024, numărul angajaților din cadrul IGSU al MAI a fost de 12 angajați. În anul 2025, 35 angajați ai IGSU al MAI au fost instruiți în cadrul a 14 cursuri desfășurate în cadrul programului de instruire al mecanismului Protecției Civile al Uniunii Europene.
	3.2.2. Desfășurarea exercițiilor internaționale în Republica Moldova	Cel puțin un exercițiu anual desfășurat; cel puțin 100 de participanți la exerciții	Anul 2023 - 450,0; anul 2024 - 450,0; anul 2025 - 450,0 bugetul IGSU al MAI; anul 2023 - 450,0 asistență externă (Uniunea Europeană, NATO); anul 2024 - 450,0 asistență externă (Uniunea Europeană, NATO); anul 2025 - 450,0 asistență externă (Uniunea Europeană, NATO)	Bugetul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne; surse externe	Trimestrul IV, 2025	Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General pentru Situații de Urgență); Ministerul Afacerilor Externe	**Realizat** În anul 2023, 332 angajați ai IGSU al MAI au fost instruiți în cadrul a 5 exerciții. În anul 2024, în cadrul a 3 exerciții au fost instruiți 155 angajați ai IGSU al MAI. În anul 2025, 83 de persoane din structurile statului și experți internaționali au participat în cadrul exercițiului de comandă și simulare asistată de calculator privind acțiunile de răspuns la situații de urgență și excepționale „Resolute Savior 25”, organizat cu suportul Centrului de Excelență pentru Managementul Crizelor din Bulgaria și al Oficiul de legătură NATO în Republica Moldova.

Obiectivul specific	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costuri de implementare (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de realizare	Instituție responsabilă și Parteneri	Progres
	3.2.3. Participarea și organizarea schimbului de experiență și bune practici	Cel puțin o vizită de studiu desfășurată	În limitele alocațiilor bugetare; surse externe	Bugetul IGSU al MAI; surse externe (Programul de instruire al Mecanismului de Protecție Civilă al Uniunii Europene)	Trimestrul IV, 2025	Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General pentru Situații de Urgență)	**Realizat** În anul 2023, 37 de angajați ai IGSU al MAI au participat în cadrul a 11 vizite de lucru, de studiu și schimb de experiență în Japonia, Polonia, Regatul Țărilor de Jos, Franța, Lituania, România și Azerbaidjan. În anul 2024, 59 de angajați ai IGSU al MAI au participat în cadrul a 28 vizite de lucru, de studiu și schimb de experiență în Austria, Belgia, Cipru, Grecia, Germania, Portugalia, România, Slovenia, Ungaria. În anul 2025, 53 de angajați ai IGSU al MAI au participat în cadrul a 8 vizite de lucru, de studiu și schimb de experiență în Austria, Estonia, Olanda, Germania, România, Suedia.
3.3. Fortificarea capacităților grupurilor-țintă (populației, autorităților administrației publice, sectorului privat, asociativ și voluntar) în gestionarea situațiilor de urgență și excepționale	3.3.1. Elaborarea planurilor de instruire/pregătire în domeniul protecției civile	7 planuri de pregătire pentru fiecare categorie de audienți elaborate	În limitele alocațiilor bugetare	Bugetul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne	Trimestrul IV, 2025	Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General pentru Situații de Urgență)	**Realizat** În anul 2023, au fost elaborate 2 Programe de formare profesională inițială a subofițerilor și ofițerilor din cadrul IGSU al MAI. În anul 2024, au fost elaborate și revizuite 5 curriculum: - privind instruirea președinților CSE; - în domeniul protecției civile a angajaților obiectivelor economice; - în domeniul acordării primului ajutor pentru subofițeri; - protecția contra incendiilor pentru administratorii de întreprinderi și instituții; - protecția contra incendiilor pentru persoanele responsabile de AÎI din întreprinderi și instituții.

Obiectivul specific	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costuri de implementare (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de realizare	Instituție responsabilă și Parteneri	Progres
	3.3.2. Organizarea și desfășurarea procesului de instruire/pregătire pentru reprezentanții autorităților publice centrale, autorităților publice locale, sectorului privat, asociativ și voluntar	Audienți din cadrul autorităților publice locale, autorităților publice centrale, sectorului privat și asociativ instruiți (minimum 1 500 de persoane anual)	În limitele alocațiilor bugetare	Bugetul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne	Trimestrul IV, 2025	Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General pentru Situații de Urgență)	**Realizat** În perioada 2023-2025, organizarea și desfășurarea procesului de instruire/pregătire au fost asigurate de către angajații Centrului republican de instruire al IGSU al MAI, în cadrul căruia au fost instruiți: - în anul 2023 - au fost instruite 3772 de persoane. - în anul 2024 - au fost instruite 2397 de persoane. - în anul 2025 - au fost instruite 3245 de persoane.
	3.3.3. Acordarea suportului autorităților publice locale în actualizarea strategiilor și planurilor pentru gestionarea situațiilor de urgență și excepționale	Suport consultativ în elaborarea strategiilor și planurilor pentru gestionarea situațiilor de urgență și excepționale acordat autorităților publice locale (număr de acte departamentale de suport elaborate, număr de ședințe de lucru desfășurate)	În limitele alocațiilor bugetare	Bugetul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne	Trimestrul IV, 2025	Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General pentru Situații de Urgență); autoritățile publice locale *Parteneri*: Congresul Autorităților Locale din Moldova	**Realizat** În anul 2023, au fost realizate următoarele: 1. organizată o vizită de lucru în zonele cu risc sporit de producere a incendiilor de vegetație din mun. Soroca, în comun cu APL și reprezentanții programului Prevention, Preparedness and Response to Natural and Man-made Disasters, East, Phase 3 (PPRD East-3); 2. participarea la ședința grupului de lucru privind posibilitatea implementării buletinelor meteorologice, cu participarea reprezentanților programului PPRD East-3 și ai Serviciul Hidrometeorologic de Stat. Totodată, a fost studiat modelul de buletin meteorologic (IBF W 2023) pentru implementarea pe teritoriul mun. Soroca; 3. organizat și desfășurat Atelierul de lucru ,,Planificarea de urgență pentru zona-pilot mun. Soroca”.

Obiectivul specific	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costuri de implementare (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de realizare	Instituție responsabilă și Parteneri	Progres
							În anul 2024, au fost realizate următoarele: 1. participarea la forumul organizat de către Consiliul raional Anenii Noi și reprezentanți ai Organizațiilor Non-Guvernamentale înregistrate în raion, care a avut drept scop reducerea sistematică a factorilor de risc și vulnerabilitățile de bază ale comunităților, abordând provocările generate, atât de dezastrele naturale, cât și de cele cu caracter tehnogen, cu elaborarea unui plan de reducere a riscurilor de dezastre; 2. participarea la ședința privind elaborarea planurilor de acțiune pentru prevenirea dezastrelor în 4 localități ale raionului Ștefan Vodă, organizată de HELVETAS Swiss Intercooperation Moldova în comun cu Consiliul raional Ștefan Vodă; 3. participarea la evenimentul de prezentare a Strategiei de Reducere a Riscului de Dezastre (RRD), organizat de consorțiul STRIVE, desfășurat în r. Anenii Noi. În anul 2025: 1. au fost examinate și coordonate 2 acte de suport a APL raionale: - Planul protecției civile al raionului Cahul; - Procedura de acțiune a Comisiei pentru situații excepționale a raionului Șoldănești în caz de pericol sau declanșare a ninsorilor puternice și/sau viscolului puternic. 2. au fost actualizate listele formațiunilor benevole de pompieri din raioanele republicii; 3. a fost asigurată participarea în cadrul a 202 ședințe cu reprezentanții APL pentru acordarea suportului în vederea prevenirii focarelor de ardere a vegetației.

Obiectivul specific	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costuri de implementare (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de realizare	Instituție responsabilă și Parteneri	Progres
	3.3.4. Desfășurarea exercițiilor, aplicațiilor practice de protecție civilă cu antrenarea autorităților publice locale, autorităților publice centrale, sectorului privat și asociativ	Cel puțin 10 exerciții, aplicații practice și de Stat Major anual cu antrenarea autorităților publice locale, autorităților publice centrale, sectorului privat și asociativ desfășurate; cel puțin 400 de persoane antrenate	În limitele alocațiilor bugetare	Bugetul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne; bugetele autorităților publice locale	Trimestrul IV, 2025	Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General pentru Situații de Urgență)	**Realizat** În anul 2023, au fost antrenate 1.611 de persoane în cadrul a 7 aplicații, 1 exercițiu de stat major și 10 exerciții tactice cu implicarea reprezentanților APL și ai Autoritățile publice centrale. În anul 2024, în cadrul a 8 aplicații, au fost antrenate 2.094 de persoane, inclusiv reprezentanți ai APL și ai APC. În anul 2025, au fost antrenate 6.923 de persoane în cadrul a 8 aplicații și 92 de exerciții tactice de specialitate interdepartamentale cu implicarea reprezentanților APL și ai APC.
3.4. Eficientizare a până în anul 2025 a activității de administrare și consolidare a capacității rezervelor de stat și de mobilizare	3.4.1. Ajustarea cadrului normativ în domeniul rezervelor de stat și de mobilizare	Proiect de lege privind modificarea Legii nr. 104/2020 cu privire la rezervele de stat și de mobilizare elaborat și aprobat de Guvern	În limitele alocațiilor bugetare	Bugetul Agenției Rezerve Materiale	Trimestrul IV, 2023	Ministerul Afacerilor Interne (Serviciul politici în domeniul rezervelor de stat și de mobilizare, Agenția Rezerve Materiale)	**Realizat** În anul 2024 a fost aprobată Legea nr. 182/2024 pentru modificarea Legii nr. 104/2020 cu privire la rezervele de stat și de mobilizare.

Obiectivul specific	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costuri de implementare (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de realizare	Instituție responsabilă și Parteneri	Progres
		Nomenclatoarele bunurilor materiale din rezervele de stat și rezervele de mobilizare actualizate și aprobate de Guvern	În limitele alocațiilor bugetare	Bugetul Agenției Rezerve Materiale	Trimestrul IV, 2023	Ministerul Afacerilor Interne (Serviciul politici în domeniul rezervelor de stat și de mobilizare, Agenția Rezerve Materiale); Ministerul Sănătății (Agenția Națională pentru Sănătate Publică)	**Realizat** Aprobate Nomenclatoarele privind bunurile din rezervele de stat și de mobilizare aprobate prin Hotărârea de Guvern din 30.07.2024.
	3.4.2. Completarea rezervelor de stat și de mobilizare cu bunuri materiale corespunzătoare necesităților de intervenție în situații de urgență/excepționale și de recuperare	Nivelul de completare a rezervelor de stat cu cel puțin 8% anual	Rezerva de stat: anul 2023 - 118 700,0; anul 2024 - 118 600,0; anul 2025 - 114 700,0	Bugetul Agenției Rezerve Materiale	Trimestrul IV, 2025	Ministerul Afacerilor Interne (Agenția Rezerve Materiale)	**Realizat** Conform planului de acumulare pentru anul 2023 au fost efectuate procurări de bunuri în sumă de 416.688,9 de mii de lei. Conform planului de acumulare pentru anul 2024 au fost efectuate procurări de bunuri materiale în rezervele de stat în sumă de 105.907,3 de mii de lei. Conform planului de acumulare pentru anul 2025 au fost efectuate procurări de bunuri pentru completarea rezervelor de stat în sumă de 58.091,3 de mii de lei.
		Nivelul de completare a rezervelor de mobilizare cu cel puțin 8 % anual	Rezerva de mobilizare: anul 2023 - 2300,0; anul 2024 - 2300,0; anul 2025 - 2400,0	Bugetul Agenției Rezerve Materiale	Trimestrul IV, 2025	Ministerul Afacerilor Interne (Agenția Rezerve Materiale)	**Realizat** În anul 2023, au fost acumulate bunuri în rezervele de mobilizare în sumă de 2.436,1 de mii de lei. În anul 2024, în conformitate cu planul de acumulare au fost acumulate bunuri în rezervele de mobilizare în sumă de 3.827,6 de mii de lei. În anul 2025, în conformitate cu planul de acumulare au fost acumulate bunuri în rezervele de mobilizare, în sumă de 57.778,8 de mii de lei.
	3.4.3. Dezvoltarea infrastructurii depozitelor Agenției Rezerve Materiale	Depozite din gestiunea Agenției Rezerve	Anul 2023 - 3000,0; anul 2024 - 3000,0	Bugetul Agenției Rezerve Materiale	Trimestrul IV, 2024	Ministerul Afacerilor Interne (Agenția Rezerve Materiale)	**Realizat** În anul 2023, urmare a procedurilor de achiziție planificate, au fost reparate 6.160 m^2 (acoperișurile depozitelor din mun. Bălți și mun. Comrat).

Obiectivul specific	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costuri de implementare (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de realizare	Instituție responsabilă și Parteneri	Progres
		Materiale reparate					În anul 2024 au fost inițiate și executate 3 proceduri de achiziții publice: - lucrări de reparație capitală a acoperișului clădirilor Depozitului, cu suprafață de 4.724,9 de m^2; - servicii de reparație curentă a pardoselilor avariate la depozitul din s. Curchi, r. Orhei; - servicii de tratare cu soluție ignifugă a acoperișurilor depozitului din cadrul Depozitului nr. 3, Depozitului nr. 4 și Depozitul principal. În anul 2025 au fost efectuate lucrări de reparație a acoperișului depozitului din mun. Chișinău cu o suprafață de 4.800 m^2. Ca urmare, a fost efectuată reparația curentă și forarea pereților pentru instalarea a 2 porți secționale (contract executat).
		Bază de produse petroliere cu capacitatea de păstrare a unui volum de 30 mii de tone construită	Anul 2023 - 50000,0; anul 2024 - 50000,0; anul 2025 - 50000,0	Bugetul Agenției Rezerve Materiale	Trimestrul IV, 2025	Ministerul Afacerilor Interne (Agenția Rezerve Materiale)	**Neinițiat** Proiectul de creare a unei baze petroliere gestionată de Agenția Rezerve Materiale a constituit o inițiativă formulată întru obținerea unor economii privind serviciile de păstrare. În acest sens, s-a analizat posibilitatea construcției, dar și identificarea terenului. Urmare analizei efectuate, consultare cu factorii decizionali, inclusiv agenții economici s-a ajuns la concluzia că crearea, gestionarea, asigurarea păstrării unei asemenea cantități de produse petroliere, precum și efectuarea împrospătării din punct de vedere economic nu este argumentată și nu este posibilă de către Agenția Rezerve Materiale. Alocările financiare pentru acest proiect nu au fost efectuate, resursele preconizate fiind redirecționate către alte necesități bugetare.

Obiectivul specific	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costuri de implementare (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de realizare	Instituție responsabilă și Parteneri	Progres
	3.4.4. Instruirea angajaților Centrului de gestionare a rezervelor materiale ale statului în scopul eliberării operative a bunurilor în situații excepționale/de urgență	Plan operativ de intervenții privind eliberarea bunurilor în situații excepționale/ de urgență elaborat	În limitele alocațiilor bugetare	Bugetul Agenției Rezerve Materiale	Trimestrul IV, 2024	Ministerul Afacerilor Interne (Agenția Rezerve Materiale)	**Realizat** A fost elaborat Planul operativ de intervenții privind eliberarea bunurilor în situații de urgență și excepționale.
		2 antrenamente, cu generalizarea rezultatelor acestora, efectuate	În limitele alocațiilor bugetare	Bugetul Agenției Rezerve Materiale	Trimestrul IV, 2024	Ministerul Afacerilor Interne (Agenția Rezerve Materiale)	**Realizat** Pe parcursul anului 2025 au fost efectuate 2 antrenamente reale cu privire la recepționarea/eliberarea în termen restrâns a bunurilor. Urmare a evaluării antrenamentelor s-a constatat că personalul antrenat în primirea și eliberarea bunurilor s-a isprăvit la nivel cu misiunea înaintată.

3.3.4 Gradul de realizare a produselor privind Obiectivul general 4

În cadrul **Obiectivului general 4**, *Sporirea capacității operaționale și de răspuns în situații de urgență și excepționale,* prezintă la finalul anului 2025, din numărul total de 19 de produse, au fost realizate următoarele măsuri:

Obiectivul specific 4.1 - au fost *realizate* 5 produse (83%) și 1 produs *în proces* (*progres avansat*) (17%).

Obiectivul specific 4.2 - au fost *realizate* 3 produse (100%).

Obiectivul specific 4.3 - au fost *realizate* 3 produse (60%) și 2 produse *în proces* (*progres avansat*) (40%).

Obiectivul specific 4.4 - au fost realizate 4 produse (80%) și 1 produs în proces (progres avansat) (20%).

Cu referire la acțiunea nerealizată, menționăm următoarele: *Acțiunea 4.4.1* - odată cu implementarea Serviciului Național Unic pentru Apelurile de Urgență 112, IGSU al MAI (SMURD) nu este implicat, din motive nedefinite, în intervențiile comune, deși figurează în Indexul de cooperare și intervenție / Indexul de caz dintre echipajele de intervenție de urgență ale Ministerul Sănătății și Ministerul Afacerilor Interne. Acest aspect împiedică IGSU al MAI să planifice indicatori relevanți și să realizeze ulterior evaluarea acestora.

Graficul nr. 13. Gradul de realizare a produselor pe obiective specifice (Obiectivul General 4)

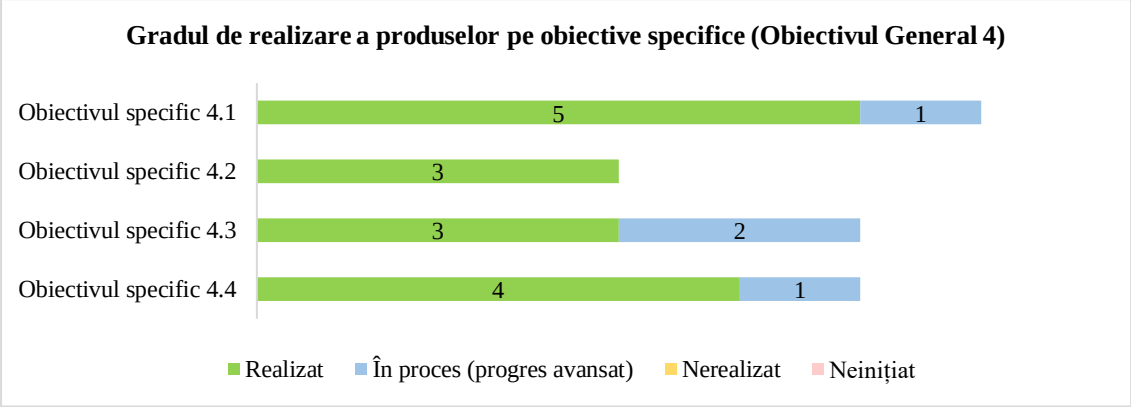

Graficul nr. 14. Gradul de realizare a produselor pe obiective specifice (Obiectivul General 4) (%)

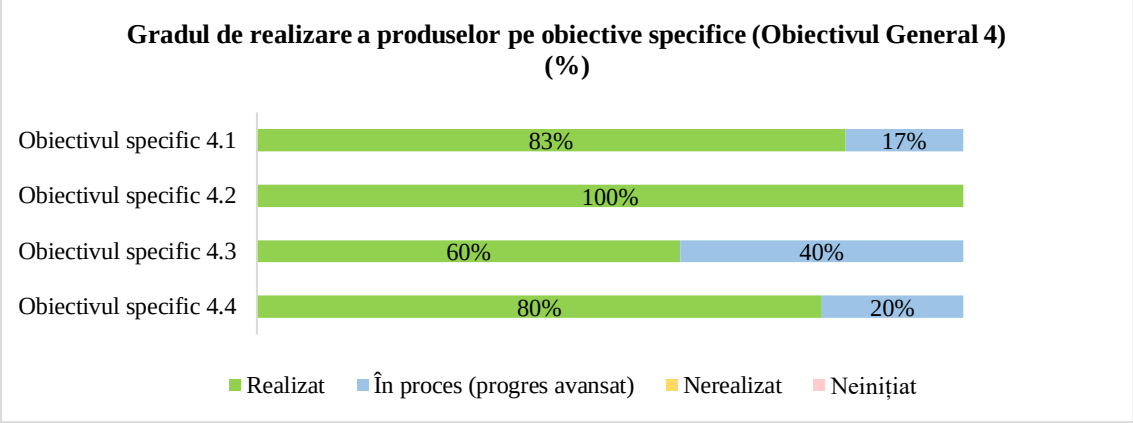

Gradul de realizare a produselor pentru Obiectivul general nr. 4 este redat în tabelul ce urmează:

Tabelul nr. 13. Progresul și gradul de realizare a produselor pentru Obiectivul general 4

Obiectivul specific	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costuri de implementare (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de realizare	Instituție responsabilă și Parteneri	Progres
4.1. Crearea până în anul 2025 a condițiilor de muncă de calitate înaltă pentru a stimula creșterea eficienței angajaților din domeniul situațiilor de urgență și excepționale	4.1.1. Revizuirea analizei/conceptului de dezvoltare a domeniului intervențiilor/de răspuns	Analiza/conceptul revizuit(ă) și aprobat(ă) prin ordin al ministrului afacerilor interne	În limitele alocațiilor bugetare	Bugetul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne	Trimestrul IV, 2025	Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General pentru Situații de Urgență)	**În proces (*progres avansat*)** Proiectul Ordinului MAI se află în proces de avizare.
	4.1.2. Renovarea structurilor/sediilor Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne	2 structuri/sedii renovate anual	Anul 2023 - 6 000,0; anul 2024 - 6 000,0; anul 2025 - 6 000,0	Bugetul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne	Trimestrul IV, 2025	Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General pentru Situații de Urgență)	**Realizat** În anul 2023 au fost renovate/construite 2 puncte de operare terestră SMURD în mun. Ungheni și or. Cantemir. În scopul construcției PSP Holercani, pe parcursul anului 2023 a fost elaborat proiectul tehnic. În anul 2024 au fost realizate: - reparații curente a edificiilor din gestiunea DRSE UTA Gagauzia; - reparații curente în cadrul Direcției situații excepționale (în continuare - *DSE*) Bălți (acoperișul PSP Costești, boxele Secției situații sxcepționale (în continuare - *SSE*) Glodeni, acoperișul SSE Rîșcani, birourile din cadrul DSE Bălți); - reparații a acoperișului a sediului SSE Florești; - reparații curente în cadrul DSE Hîncești (termoizolarea fațadei a USP Iargara). În anul 2025 a fost demarată construcția PSP Holercani, din s. Holercani, r. Dubăsari.

Obiectivul specific	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costuri de implementare (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de realizare	Instituție responsabilă și Parteneri	Progres
	4.1.3. Reconstruirea și/sau construirea sediilor de salvatori și pompieri	6 remize de salvatori și pompieri construite/ reconstruite	Anii 2024-2025: 7 200,0 - bugetul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne; 70 000,0 (3,5 mil. dolari SUA) - asistență externă din proiecte de asistență tehnică în cadrul Programului de asistență umanitară al Departamentului Apărării SUA	Bugetul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne; surse externe	Trimestrul IV, 2025	Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General pentru Situații de Urgență)	**Realizat** În anul 2023 a fost construit și operaționalizat Dispeceratul Integrat pentru situații de urgență „Nord”, fapt ce a îmbunătățit semnificativ procesul de gestionare a situațiilor de urgență pentru toată zona nordică a țării, întrucât acesta preia și gestionează apelurile de urgență din mun. Bălți și din 11 raioane din nordul Republicii Moldova. Totodată, în perioada menționată au fost continuate lucrările de construcție a USP Șoldănești, precum și demarate lucrările de construcție a USP Ocnița, USP Dondușeni și USP Căinari. În anul 2024 au continuat lucrările de reconstrucție la următoarele subdiviziuni: - în cadrul USP Dondușeni au fost finisate lucrările de reparație; - în cadrul USP Ocnița a fost inițiată procedura de achiziție a lucrărilor de finalizare (contract executat); - în cadrul USP Căinari au fost finalizate lucrările de construcție. În anul 2025 au fost desfășurate ceremoniile oficiale de inaugurare a 4 sedii a unităților de salvatori și pompieri.
	4.1.4. Operaționalizarea structurilor de salvatori și pompieri construite/înființate	Număr de echipamente și utilaje procurate	Anul 2023 - 1 500,0; anul 2024 - 1 500,0; anul 2025 - 1 500,0	Bugetul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne	Trimestrul IV, 2025	Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General pentru Situații de Urgență)	**Realizat** În anul 2023 au fost achiziționate: 1. 187 de furtunuri pentru stingere a incendiilor, distribuite în cadru a 18 subdiviziuni ale IGSU al MAI; 2. 114 de trackere GPS, dintre care 106 au fost instalate pe unitățile de tehnică din 13 subdiviziuni. În anul 2024 au fost achiziționate: 1. 3 seturi de echipamente de descarcerare, de tip Holmatro;

Obiectivul specific	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costuri de implementare (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de realizare	Instituție responsabilă și Parteneri	Progres
							2. dispozitiv pentru testarea echipamentului de protecție Drager Quaeste. În anul 2025 au fost achiziționate: 1. 45 de aparate cu aer comprimat pentru respirație; 2. 165 furtunuri pentru stingerea incendiilor, care au fost distribuite în subdiviziunile DSE Chișinău; De asemenea, au fost recepționate 2 motopompe pentru ape murdare Wacker Neuson (distribuite în DSE Soroca) (proiectul „Sprijin în atenuarea impactului războiului pentru alimentare cu apă și canalizare în regiunea de graniță a Moldovei cu Ucraina”). În aceeași perioada, au fost recepționate și distribuite, cu titlu de ajutor umanitar, în subdiviziunile IGSU al MAI: - 6 generatoare electrice, donație Belgia; - 5 generatoare electrice, donație Belgia; - 31 de pompe de căldură, donație Suedia; - 16 de centrale electrice de căldură, donație Suedia.
	4.1.5. Securizarea energetică a structurilor Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne	Cel puțin 5 structuri securizate I	Anul 2023 - 7 000,0; anul 2024 - 7 000,0; anul 2025 - 7 000,0	Bugetul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne	Trimestrul IV, 2025	Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General pentru Situații de Urgență)	**Realizat** În anul 2024 au fost realizate următoarele lucrări: 1. Finalizarea lucrărilor de instalare a sistemului de securizare energetică (instalație de transmisie) la construcția USP Șoldănești; 2. Finalizarea lucrărilor de instalare a sistemului de securizare energetică la construcția USP Hîncești; 3. Finalizarea lucrărilor de instalare a sistemului de securizare energetică la construcția USP Cimișlia; 4. Finalizarea lucrărilor de instalare sistemului de securizare energetică la construcția USP Ocnița;

Obiectivul specific	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costuri de implementare (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de realizare	Instituție responsabilă și Parteneri	Progres
							5. Finalizarea lucrărilor de instalare sistemului de securizare energetică la construcția USP Căinari; 6. Finalizarea lucrărilor de instalare sistemului de securizare energetică la construcția USP Dondușeni. Ca urmare, sistemele de securizare energetică instalate la sediilor SSE Basarabeasca, SSE Taraclia, SSE Cantemir, SSE Comrat și DRSE UTA Gagauzia au fost puse în funcțiune. În anul 2025 au fost securizate energetic sediile SSE Ocnița, SSE Dondușeni, SSE Șoldănești, DSP Ciocana, iar la SSE Căinari până la finele lunii decembrie urmează semnarea actelor la Premier Energy pentru delimitare și punerea în funcțiune.
	4.1.6. Antrenarea voluntarilor în misiunile de intervenție	Cel puțin 120 de voluntari antrenați în misiuni de intervenție	În limitele alocațiilor bugetare	Bugetul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne	Trimestrul IV, 2025	Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General pentru Situații de Urgență) *Parteneri*: autoritățile publice locale	**Realizat** În anul 2023 au avut loc 1712 misiuni de intervenție, la care au intervenit 335 de voluntari din cadrul a 64 de posturi. În anul 2024 au avut loc 343 de misiuni de intervenție, la care au intervenit 165 de voluntari. În anul 2025 au avut loc 331 de misiuni de intervenție, la care au intervenit 121 de voluntari. Intervențiile menționate nu au presupus cheltuieli din partea IGSU al MAI, acestea fiind acoperite de autoritățile administrației publice locale.
4.2. Asigurarea până în anul 2025 a condițiilor conforme normelor pentru toate tipurile de intervenții	4.2.1. Procurarea autospecialelor de intervenție	58 de autospeciale procurate (49 de autocisterne și 9 autoscări)	Anul 2023 - 255 200,0; anul 2024 - 255 200,0; anul 2025 - 255 200,0	Bugetul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne	Trimestrul IV, 2025	Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General pentru Situații de Urgență)	**Realizat** La 20.01.2023 a fost semnat contractul dintre IGSU al MAI din Republica Moldova și compania „Toyota Tsusho Corporation” din Japonia, privind fabricarea și livrarea în Republica Moldova a 19 autospeciale de intervenție, bazată pe șasiu european, destinate serviciului de salvatori și pompieri, după cum urmează: 1. 8 autoscări cu lungime de 30 de m; 2. 2 autoscări cu lungimea de 54 de m;

Obiectivul specific	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costuri de implementare (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de realizare	Instituție responsabilă și Parteneri	Progres
							3. 3 autocisterne cu capacitatea de 3000 de litri; 4. 4 autocisterne cu capacitatea de 4000 de litri; 5. 2 autocisterne cu capacitatea de 10000 de litri. Ca urmare, tehnica produsă în Japonia urma a fi livrată în Republica Moldova într-un termen de 23 de luni. În anul 2025 au fost recepționate 19 autospeciale de intervenție, sosite din Japonia. În cadrul proiectului „WASSER - sprijin în atenuarea impactului războiului pentru alimentare cu apă și canalizare în regiunea de graniță a Moldovei cu Ucraina” a fost recepționat 1 vehicul specializat pentru intervenții în zone greu accesibile, de tip Can Am Traxter (distribuit în cadrul DSE Soroca). Totodată, au fost recepționate din donații 1 automobil de teren, model Nissan Patrol, pentru Centrul de Dirijare și Intervenții Operativă „Nord” (donație PNUD), și 1 autospecială de intervenție, model Steyr 13S, destinată SSE Telenești (donație a Austriei).
	4.2.2. Procurarea echipamentelor de protecție	Echipamente de protecție procurate (120 de seturi anual)	Anul 2023 - 9 700,0; anul 2024 - 9 700,0; anul 2025 - 9 700,0	Bugetul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne	Trimestrul IV, 2025	Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General pentru Situații de Urgență)	**Realizat** În anul 2023 au fost achiziționate și repartizate efectivului de salvatori și pompieri din cadrul subdiviziunilor IGSU al MAI, următoarele bunuri: 1. 450 de costume de protecție pentru pompieri cu mănuși și jambiere; 2. 50 de căști de protecție pentru pompieri 3. 450 de centuri de siguranță pentru pompieri; 4. 250 de cagule pentru pompieri. Astfel, fiind achiziționate 250 de seturi. În anul 2024 au fost achiziționate și repartizate următoarele bunuri: 1. 550 perechi de bocanci (cizme) de protecție pentru pompieri; 2. 435 de căști de protecție pentru pompieri;

Obiectivul specific	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costuri de implementare (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de realizare	Instituție responsabilă și Parteneri	Progres
							3. 150 seturi de costume de protecție pentru pompieri; 4. 150 perechi mănuși de protecție pentru pompieri; 5. 150 bucăți centură pentru pompieri. Astfel, fiind achiziționate 150 de seturi. În anul 2025 au fost achiziționate și repartizate următoarele bunuri: 1. 600 bocanci de protecție; 2. 430 de căști de protecție pentru pompieri; 3. 100 de mănuși de protecție pentru pompieri; 4. 100 de costume de protecție pentru pompieri de tip ușor. 5. 100 de costume de protecție pentru pompieri; 6. 140 de costume de protecție pentru pompieri de tip ușor. Astfel, fiind achiziționate 240 de seturi.
	4.2.3. Procurarea echipamentelor de suport logistic pentru misiuni externe	Echipamente de suport logistic procurate (un set)	Anul 2023 - 2 500,0; anul 2024 - 2 500,0; anul 2025 - 2 500,0	Bugetul IGSU al MAI	Trimestrul IV, 2025	Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General pentru Situații de Urgență)	**Realizat** În anul 2023 au fost valorificați 2.000.000 de lei, alocați către DRCS nr. 2, pentru procurarea echipamentului de suport logistic destinat Echipei USAR Moldova (ceea ce constituie 30% din necesar). În anul 2024 au fost elaborate cerințele tehnice pentru autospecialele de intervenție, pentru modulul de intervenție GFFFV și pentru modulul USAR, ca urmare a acordării granturilor de către Banca Mondială pentru achiziționarea tehnicii de intervenție.
4.3. Dezvoltarea capacității de furnizare a asistenței internaționale în materie	4.3.1. Operaționalizarea modulului de pompare de mare capacitate	Modul de pompare de mare capacitate operaționalizat (număr de angajați instruiți,	5 500,0 - bugetul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al Ministerului	Bugetul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al Ministerului	Trimestrul IV, 2025	Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General pentru Situații de Urgență)	**În proces** **(*progres avansat*)** În anul 2023, au fost realizate următoarele acțiuni: 1. evaluată capacitatea subdiviziunilor IGSU al MAI pentru identificarea resurselor umane și tehnice pentru formarea Modulului de pompare de mare capacitate (în continuare - HCP);

Obiectivul specific	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costuri de implementare (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de realizare	Instituție responsabilă și Parteneri	Progres
de protecție civilă		număr de echipamente procurate)	Afacerilor Interne; 5 500,0 - negocieri, asistență externă (Uniunea Europeană)	Afacerilor Interne; surse externe			2. formată structura și componența Modulului HCP; 3. testată capacitatea și componența echipei pre-selectate pentru formarea Modulului HCP prin participarea la 2 exerciții internaționale. În anul 2025, 36 de angajați ai IGSU al MAI au participat în cadrul Exercițiului internațional de teren pe bază de module de intervenție „EU-MODEX Bulgaria 2025”, desfășurat în or. Montana, Bulgaria.
	4.3.2. Operaționalizarea modulului USAR (Urban Search and Rescue)	Modul USAR (Urban Search and Rescue) operaționalizat (număr de cursuri de pregătire realizate, număr de persoane instruite, număr de dotări procurate)	30 800,0 - bugetul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne; 30 800,0 - negocieri, asistență externă (Uniunea Europeană), Solidarity Fund (Polonia)	Bugetul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne; surse externe	Trimestrul IV, 2025	Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General pentru Situații de Urgență)	**În proces** **(*progres avansat*)** În anul 2023, la modulul USAR: 1. a fost aprobat/actualizat cadrul normativ al modulelor instruire/intervenție; 2. au fost instruiți 11 angajați cu funcții de conducere, din cadrul echipei USAR, cu suportul Fundației „Solidarity Fund PL” în Moldova și Institutul „iHELP” din Republica Polonă. Cursul a vizat instruirea privind utilizarea Sistemului de coordonare și management INSARAG „ICSM Management Tools” și a platformei Virtual OSOCC. 1. au fost instruiți 10 angajați cu funcții de conducere, din cadrul echipei USAR, cu suportul Fundației „Solidarity Fund PL” în Moldova și Institutul „iHELP” din Republica Polonă. Cursul a vizat instruirea privind utilizarea Sistemului de coordonare și management INSARAG, funcționalitatea RDC și UCC. Cheltuielile pentru cursurile de instruire au fost suportate de către Guvernul Poloniei, prin intermediul Fundației „Solidarity Found PL” în Moldova. 2. a fost desfășurat exercițiul de testare a procesului de clasificare externă echipei de căutare - salvare urbană USAR Moldova.

Obiectivul specific	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costuri de implementare (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de realizare	Instituție responsabilă și Parteneri	Progres
							Capacitățile de funcționare a modulelor au fost testate: - în perioada 06-17.02.2023, în timpul misiunii de acordare a sprijinului autorităților turcești la efectuarea operațiunilor de căutare-salvare urbană în urma cutremurului de pământ; - în perioada 10-21.06.2023, în cadrul exercițiului regional de teren la scară largă „TbiEX Georgia 2023”. În anul 2024 au fost realizate: 1. prin Ordinul IGSU a fost aprobat Planul de acțiuni pentru anul 2024 în vederea pregătirii echipei de căutare-salvare urbană USAR Moldova către clasificarea externă, în conformitate cu cerințele ghidurilor INSARAG; 2. instruirea a 12 angajați, activitate desfășurată în cadrul proiectului „Consolidarea capacității grupului de căutare și salvare din Moldova în conformitate cu standardele ONU”; 3. participarea a 30 de angajați a echipei USAR la Atelierul practic „Organizarea operațiunilor de căutare-salvare și îmbunătățirea tehnicilor de salvare”; 4. participarea a 30 de angajați a echipei USAR la programul de instruire de bază pentru căutare-salvare urbană a echipei USAR Moldova, organizat cu suportul Organizației „Turkish Cooperation and Coordination Agency (TIKA)”, din Republica Turcă; 5. participarea a 6 angajați la Stagiul de perfecționare în „Managementul acțiunilor de căutare- salvare urbană”; 6. a fost transmisă solicitarea, către IMSPD „Serviciul medical al MAI” pentru identificarea și dispunerea a doi medici chirurgi în cadrul echipei USAR Moldova, precum și pentru analizarea posibilităților de vaccinare a membrilor echipei în vederea desfășurării misiunilor internaționale;

Obiectivul specific	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costuri de implementare (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de realizare	Instituție responsabilă și Parteneri	Progres
							7. 1 angajat a participat în cadrul Reuniunii regionale INSARAG Africa-Europa-Orientul Mijlociu 2024, desfășurată în or. București, România; 8. 2 angajați au participat la Cursul de coordonare USAR, organizat de Direcția Generală Protecție Civilă și Operațiuni Umanitare Europene (DG ECHO), în localitatea Volterra, Italia. În anul 2025, 71 angajați ai IGSU al MAI și 2 angajați ai IMSPD „Serviciul medical al MAI" (efectivul echipei USAR Moldova) au participat la 8 activități de instruire și pregătire. De asemenea, au achiziționate 28 de seturi de echipamente pentru debitat beton, în valoare de 2.200.000,0 de lei.
	4.3.3. Operaționalizarea submodulului de suport logistic pentru realizarea misiunilor externe	Submodul de suport logistic creat (număr de angajați instruiți, număr de echipamente procurate)	19 800,0 - bugetul IGSU al MAI; 19 800,0 - negocieri, asistență externă (UE)	Bugetul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne; surse externe	Trimestrul IV, 2025	Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General pentru Situații de Urgență)	**Realizat** În anul 2023, au fost valorificați 2.000.000,0 de MDL (100%) alocați pentru dezvoltarea sub-modulului logistic. Capacitățile de funcționare a modulului au fost testate în timpul misiunii de sprijin a autorităților turcești pentru efectuarea operațiunilor de căutare-salvare urbană în urma cutremurului de pământ, precum și în cadrul exercițiului regional de teren la scară largă „TbiEX Georgia 2023". Modulul este operațional.
	4.3.4. Operaționalizarea echipei de asistență și suport tehnic	Echipă de asistență și suport tehnic creată și dotată cu echipamente	5 500,0 - bugetul IGSU al MAI; 5 500,0 - negocieri, asistență externă (Uniunea Europeană)	Bugetul IGSU al MAI; surse externe	Trimestrul IV, 2025	Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General pentru Situații de Urgență)	**Realizat** Crearea echipei de asistență și suport tehnic a fost realizată conform Ordinul IGSU nr. 203 din 04.09.2025.

Obiectivul specific	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costuri de implementare (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de realizare	Instituție responsabilă și Parteneri	Progres
	4.3.5. Crearea rezervei naționale de experți în protecție civilă	Cel puțin 8 persoane identificate și instruite	În limitele alocațiilor bugetare	Bugetul IGSU al MAI	Trimestrul IV, 2025	Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General pentru Situații de Urgență)	**Realizat** În anul 2023, 6 angajați ai IGSU al MAI au participat la 3 cursuri de instruire. În anul 2024, 19 angajați ai IGSU al MAI au fost instruiți în cadrul a 19 activități de formare a experților în domeniul protecției civile. În anul 2025, 37 angajați ai IGSU al MAI au participat la 16 cursuri de instruire.
4.4. Sporirea până în anul 2024 a rezilienței la situații care pun în pericol sănătatea oamenilor	4.4.1. Elaborarea și aprobarea unui ordin comun al ministrului afacerilor interne și ministrului sănătății privind stabilirea competențelor și atribuțiilor echipajelor publice de intervenție de diferite niveluri în faza prespitalicească	Ordin comun elaborat și aprobat	În limitele alocațiilor bugetare	Bugetul autorităților implicate	Trimestrul IV, 2024	Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General pentru Situații de Urgență); Ministerul Sănătății	**În proces** **(*progres avansat*)** Odată cu implementarea Serviciului Național Unic pentru Apelurile de Urgență 112, SMURD al IGSU al MAI nu a fost implicat în intervențiile comune (din motive nedefinite), deși este inclus în Indexul de cooperare și intervenție / indexul de caz al echipajelor de intervenție de urgență ale Ministerului Sănătății și Ministerului Afacerilor Interne. În anul 2025 a fost elaborat Proiectul de procedură și transmis spre avizare către Ministerul Sănătății, Ministerul Finanțelor, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și Agenției Proprietăți Publice. Astfel, în luna mai 2025, proiectul de procedură a fost înaintat repetat Ministerului Sănătății pentru a comunica decizia și poziția sa privind proiectul menționat (un răspuns oficial nu a fost recepționat).
	4.4.2. Elaborarea regulamentelor și a procedurilor de cooperare a serviciilor medicale de urgență naționale cu SMURD	Cel puțin un regulament și 2 proceduri de cooperare a serviciilor medicale de urgență naționale cu SMURD aprobate	În limitele alocațiilor bugetare	Bugetul autorităților implicate	Trimestrul IV, 2024	Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General pentru Situații de Urgență); Ministerul Sănătății	**Realizat** În anul 2023 au fost elaborate: 1. Regulamentul privind procedura de efectuare a misiunilor transfrontaliere cu ambulanțele Serviciului mobil de urgență, reanimare și descarcerare (SMURD), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 675/2023; 2. Regulamentul de activitate a echipajelor de prim ajutor calificat a Serviciului mobil de urgență, reanimare și descarcerare.

Obiectivul specific	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costuri de implementare (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de realizare	Instituție responsabilă și Parteneri	Progres
	4.4.3. Ajustarea de comun cu Ministerul Sănătății a procedurilor și mecanismelor necesare privind antrenarea echipajelor SMURD la apelurile de urgență ale cetățenilor pentru acordarea primului ajutor calificat	Proceduri și mecanisme necesare privind antrenarea echipajelor SMURD la apelurile de urgență ale cetățenilor pentru acordarea primului ajutor calificat, ajustate în comun cu Ministerul Sănătății	În limitele alocațiilor bugetare	Bugetul autorităților implicate	Trimestrul IV, 2024	Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General pentru Situații de Urgență); Ministerul Sănătății	**Realizat** În anul 2022 a fost aprobată procedura de operare comună privind preluarea, transportarea și predarea unor preparate medicamentoase la solicitarea Ministerului Sănătății sau a Departamentului pentru Situații de Urgență din România în caz de urgențe medicale.
		Număr de intervenții desfășurate în acordarea serviciilor de prim ajutor medical calificat cetățenilor	În limitele alocațiilor bugetare	Bugetul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne	Trimestrul IV, 2024	Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General pentru Situații de Urgență)	**Realizat** În anul 2023 au fost desfășurate 19 intervenții ale SMURD, după cum urmează: 1. misiuni primare - 1; 2. misiuni secundare - 14; 3. misiuni transfrontaliere - 4. În anul 2024, SMURD a fost desfășurată o misiune transfrontalieră de transportare a unui pacient, cetățean al Republicii Moldova, din România în Republica Moldova. În anul 2025, SMURD a fost desfășurată o misiune transfrontalieră.
	4.4.4. Instruirea formatorilor de paramedici	50 de formatori de paramedici instruiți	Anul 2023 - 275,0; anul 2024 - 275,0; anul 2025 - 275,0	Bugetul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al Ministerului	Trimestrul IV, 2025	Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General pentru Situații de Urgență)	**Realizat** În anul 2023, 4 angajați ai IGSU al MAI au obținut statutul de formator, în cadrul Cursului de Instructor în Acordarea Primului Ajutor calificat, Descarcerare și Operațiuni de Salvare desfășurat la Centrul de Formare Formatori și Pregătire în Descarcerare și Asistență Medicală de Urgență din cadrul ISU „Horea”, jud. Mureș, România, iar 12

Obiectivul specific	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costuri de implementare (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de realizare	Instituție responsabilă și Parteneri	Progres
				Afacerilor Interne			angajați au fost instruiți în cadrul curs de instruire pentru paramedici. În anul 2024, 38 de angajați ai IGSU al MAI au fost instruiți în cadrul a 3 cursuri de instruire în domeniul „Acordării primului ajutor calificat și descarcerare”. În anul 2025, 24 de angajați ai IGSU al MAI au fost instruiți la capitolul „Acordarea primului ajutor calificat și descarcerare”.

3.4 Constatări privind costurile Programului

Pentru perioada 2022-2025, costurile planificate pentru întregul program au fost stabilite la un total de **1.929.898,0 mii lei**. Aceste fonduri au fost împărțite între diferitele surse de finanțare, care includ bugetul Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, bugetul Agenției Rezerve Materiale și sursele externe provenite de la partenerii de dezvoltare. Detalierea sumelor planificate pe fiecare sursă de finanțare este următoarea:

1. Sursele planificate în **bugetul de stat** la etapa **planificării constituiau 449.446,7 mii lei**.

2. **Surse externe (parteneri de dezvoltare)**: fondurile planificate din sursele externe, prin parteneriate cu instituții internaționale și organizații de dezvoltare, au fost estimate la **1.480.451,3 mii lei**. Aceste surse trebuiau să contribuie la implementarea unor proiecte de dezvoltare a infrastructurii IGSU al MAI.

Potrivit Programului, costurile estimative pentru realizarea obiectivelor specifice au fost repartizate potrivit tabelului:

Tabelul nr. 14. Costurile estimative

Obiectiv specific	**Costuri pe ani**				**Costuri acoperite în Cadrul bugetar pe termen mediu** (mii lei)	**Costuri care excedează Cadrul bugetar pe termen mediu** (mii lei)	**Costuri totale** (mii lei)
	2022 (mii lei)	**2023** (mii lei)	**2024** (mii lei)	**2025** (mii lei)			
1.1. Perfecționarea legislației în domeniul situațiilor de urgență și excepționale	-	16491,0	16491,0	16491,0	49473,0	-	49473,0
2.1. Operaționalizarea până în anul 2025 a sistemului național de avertizare timpurie	-	2500,0	55000,0	55000,0	8500,0	104000,0	112500,0
2.2. Consolidarea activității de comunicare și informare preventivă	-	3600,0	4000,0	4000,0	-	11600,0	11600,0
2.3. Sporirea până în anul 2025 a gradului de integrare și implicare a voluntariatului în viața comunității	-	-	-	-	-	-	-
2.4. Creșterea calității procesului instituțional de expertiză în prevenirea situațiilor de urgență și excepționale	-	2000,0	2000,0	2100,0	-	6100,0	6100,0
3.1. Dezvoltarea capacităților naționale de pregătire și instruire în situații de urgență și excepționale	-	60000,0	60000,0	62000,0	-	182000,0	182000,0
3.2. Valorificarea oportunităților de participare la instruiri/exerciții pe plan internațional	-	900,0	900,0	900,0	-	2700,0	2700,0
3.3. Fortificarea capacităților grupurilor-țintă (populației, autorităților administrației publice, sectorului privat, asociativ și voluntar) în gestionarea situațiilor de urgență și excepționale	-	-	-	-	-	-	-
3.4. Eficientizarea până în anul 2025 a activității de administrare și consolidare a capacităților rezervelor de stat și de mobilizare	-	174000,0	173900,0	167100,0	341119,7	173880,3	515000,0
4.1. Crearea până în anul 2025 a condițiilor de muncă de calitate înaltă pentru a stimula creșterea eficienței angajaților din domeniul situațiilor de urgență și excepționale	-	41400,0	41400,0	41500,0	9600,0	114700,0	124300,0

Tabelul nr. 13 (continuare). Costurile estimative

Obiectiv specific	Costuri pe ani				Costuri acoperite în Cadrul bugetar pe termen mediu (mii lei)	Costuri care excedează Cadrul bugetar pe termen mediu (mii lei)	Costuri totale (mii lei)
	2022 (mii lei)	2023 (mii lei)	2024 (mii lei)	2025 (mii lei)			
4.2. Asigurarea până în anul 2025 a condițiilor conforme normelor pentru toate tipurile de intervenții	-	267400,0	267400,0	267400,0	29100,0	773100,0	802200,0
4.3. Dezvoltarea capacității de furnizare a asistenței internaționale în materie de protecție civilă	-	40000,0	40000,0	43200,0	11654,0	111546,0	123200,0
4.4. Sporirea până în anul 2024 a rezilienței la situații care pun în pericol sănătatea oamenilor	-	275,0	275,0	275,0	-	825,0	825,0
Total	-	**608566,0**	**661366,0**	**659966,0**	**449446,7**	**1480451,3**	**1929898,0**

În perioada de referință, implementarea Programului a fost susținută prin următoarele alocări financiare.

1. **Bugetul de stat**. Din bugetul de stat au fost utilizate efectiv **497.419,0 mii de lei**. Aceste resurse au fost direcționate preponderent către acțiuni ce vizează modificarea cadrului normativ și administrativ, realizarea de evaluări, analize și studii de specialitate. Deși, din punct de vedere numeric, acțiunile aferente dotării și echipării finanțate din bugetul de stat sunt mai puține, acestea dețin o pondere semnificativă, reprezentând aproximativ **25%** din totalul resurselor alocate din această sursă.
2. **Surse externe**. Din fondurile externe puse la dispoziție de partenerii de dezvoltare au fost utilizate efectiv **100.196,0 mii lei**. Aceste resurse au fost destinate în principal pentru a sprijini autoritățile naționale în procesul de consolidare instituțională și dezvoltare a capabilităților operaționale. Cea mai mare parte a finanțării a fost orientată către dotarea cu echipamente, modernizarea infrastructurii și implementarea tehnologiilor avansate pentru controlul și securizarea frontierei.
3. **Costurile neacoperite**. Valoarea costurilor neacoperite în perioada analizată se ridică la **1.419.663 mii lei**, reflectând necesități financiare identificate care nu au beneficiat de surse de finanțare disponibile.

În acest context, pe termen lung, este necesar de a dezvolta la nivel național capacitățile de acoperire a necesităților pentru dezvoltarea sistemului protecției civile.

Sursele de finanțare a Programului sunt redate în graficele ce urmează:

Graficul nr. 15. Sursele de finanțare a Programului, 2022-2025 (MDL)

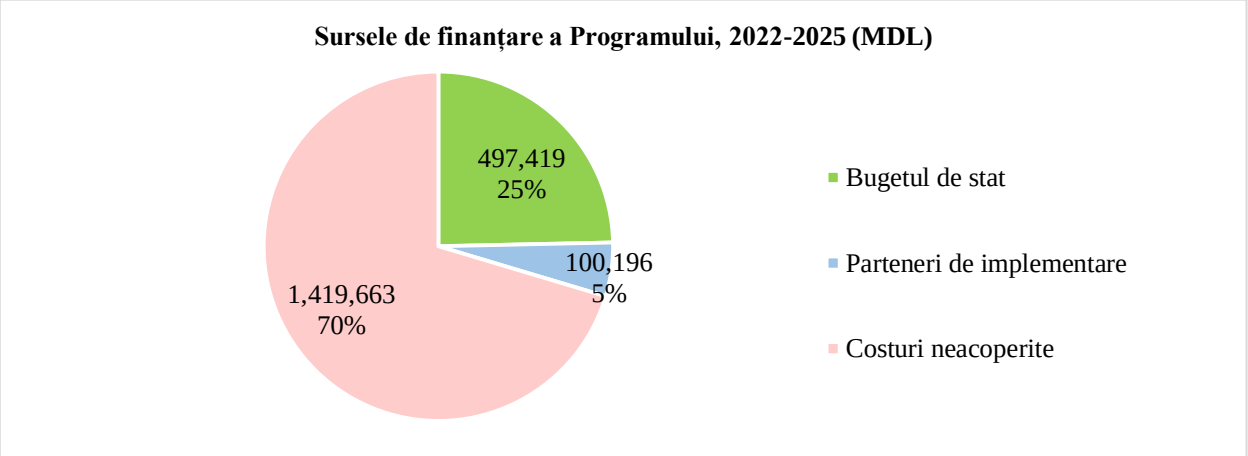

Graficul nr. 16. Sursele de finanțare a Programului, pe obiective specifice, 2022-2025 (%)

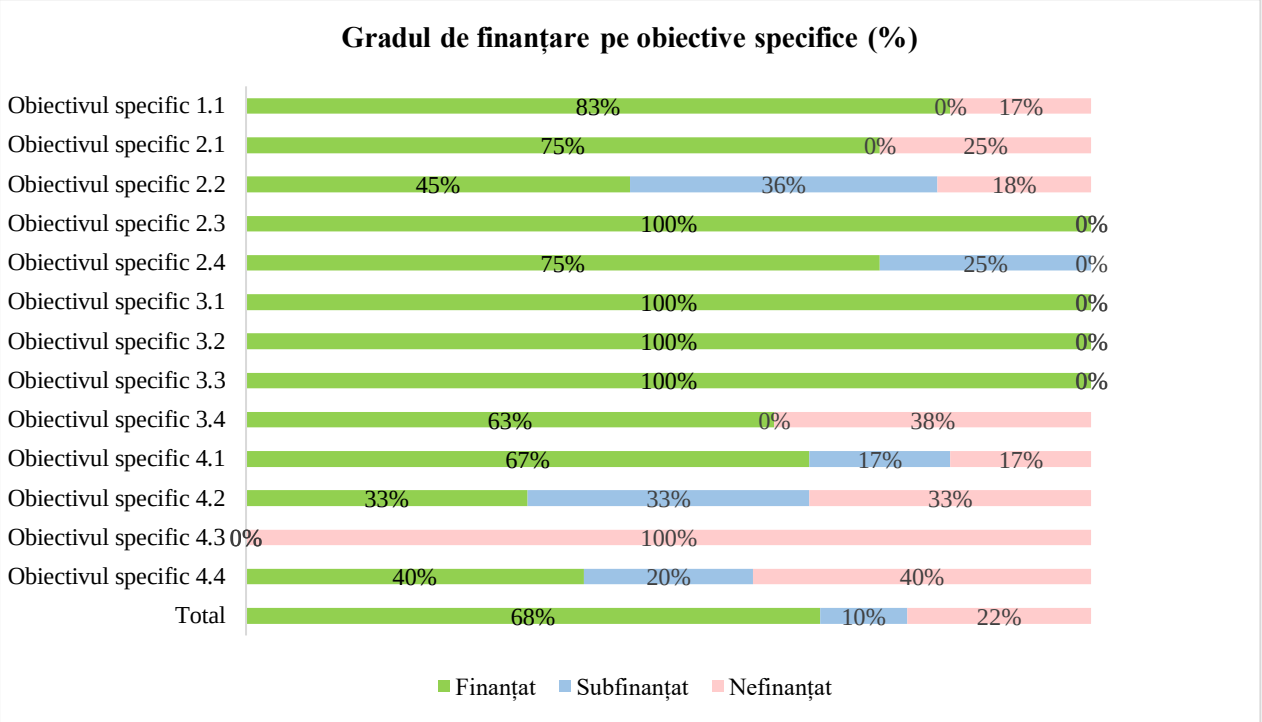

Elaborarea Programului de prevenire și gestionare a situațiilor de urgență și excepționale a reprezentat un proces esențial, orientat spre consolidarea unui sistem eficient, coordonat și rezilient, destinat salvării vieților omenești, protejării bunurilor materiale și a mediului înconjurător, reducerii riscurilor și vulnerabilităților, precum și diminuării impactului socio-economic al situațiilor de urgență și excepționale asupra societății. Cu toate acestea, majoritatea activităților implementate au fost realizate cu sprijinul partenerilor externi, care au avut un rol determinant în susținerea procesului de implementare.

În ceea ce privește solicitările de alocare a resurselor pentru realizarea obiectivelor strategice, s-a constatat o reticență din partea autorităților competente în direcționarea fondurilor necesare. Această situație poate fi explicată printr-o percepție insuficientă asupra importanței investițiilor pe termen lung în domeniul prevenirii și gestionării situațiilor de urgență și excepționale. În consecință, se ratează oportunități de dezvoltare a unor proiecte care ar putea contribui semnificativ la creșterea capacității de răspuns și la reducerea riscurilor asociate situațiilor de urgență și excepționale.

Pe de altă parte, majoritatea dintre activitățile realizate au fost susținute din fonduri externe, fapt ce a permis IGSU al MAI să modernizeze echipamentele și metodele de intervenție, să organizeze sesiuni de instruire pentru angajați și să dezvolte mecanisme eficiente de cooperare interinstituțională. Colaborările internaționale au fost esențiale pentru compensarea constrângerilor bugetare și pentru asigurarea continuității implementării acțiunilor prevăzute în Program. Totuși, dependența de finanțarea externă generează anumite provocări, inclusiv vulnerabilitatea la fluctuațiile disponibilității fondurilor și necesitatea alinierii priorităților naționale la cele ale partenerilor externi.

4. Concluzii

Programul de prevenire și gestionare a situațiilor de urgență și excepționale pentru anii 2022–2025 a constituit un instrument important pentru consolidarea domeniului protecției civile în Republica Moldova. Implementarea acestuia a contribuit la dezvoltarea capacităților instituționale și operaționale de prevenire și gestionare a situațiilor de urgență, precum și la alinierea mecanismelor naționale la standardele europene în domeniu.

O relevanță deosebită în contextul parcursului european al Republicii Moldova, prin promovarea cooperării privind participarea echipelor de salvatori și pompieri ale Republicii Moldova la activitățile desfășurate în cadrul Mecanismului de Protecție Civilă al Uniunii Europene.

Evaluarea finală a Programului a evidențiat un grad mediu de implementare de peste **75%**, luând în considerare nivelurile de impact, rezultat și realizarea indicatorilor de monitorizare.

În urma implementării acțiunilor planificate, au fost înregistrate următoarele rezultate: din cei 78 de indicatori de monitorizare planificați pentru perioada 2022-2025, 55 de indicatori (71%) au fost realizați, 15 indicatori (19%) sunt în proces (progres avansat) de realizare, însă nu au fost finalizați în termenele stabilite, 3 indicatori (4%) au rămas nerealizați și 5 indicatori (6%) nu au fost inițiați.

Implementarea Programului a pus un accent important pe informarea și educarea populației cu privire la comportamentul adecvat în situații de urgență și excepționale, contribuind la promovarea unei culturi a prevenirii și la creșterea responsabilității civice.

Procesul de implementare a Programului s-a desfășurat într-un context caracterizat de anumite constrângeri bugetare și de necesitatea consolidării cooperării între autoritățile administrației publice centrale și locale. Cu toate acestea, progresele înregistrate indică o evoluție pozitivă în direcția alinierii sistemului național de protecție civilă la standardele europene.

În același timp, în procesul de implementare au fost identificate unele dificultăți care au influențat gradul de realizare a acțiunilor planificate, în special insuficiența alocațiilor financiare necesare pentru realizarea tuturor măsurilor planificate.

Totodată, lipsa unei conlucrări instituționale suficiente cu Ministerul Sănătății în vederea stabilirii clare a competențelor și atribuțiilor echipajelor de intervenție în cadrul misiunilor de acordare a asistenței medicale urgente și a primului ajutor.

În ansamblu, Programul pentru perioada 2022-2025 a contribuit la consolidarea rezilienței instituționale și comunitare în Republica Moldova și la dezvoltarea capacităților de prevenire și gestionare a situațiilor de urgență.

Recomandări

În vederea îmbunătățirii procesului de implementare și evaluare a programelor în domeniul protecției civile, se propun următoarele recomandări:

- **Planificare strategică**: Elaborarea unui calendar detaliat privind procesul de evaluare, care să includă etapele de colectare și analiză a datelor, în vederea reducerii presiunii generate de termenele limită.

- **Colaborare interinstituțională:** Consolidarea comunicării și cooperării între autoritățile implicate în implementarea programelor, pentru a facilita accesul la informațiile necesare și la resursele relevante pentru procesul de monitorizare și evaluare.
- **Formare profesională:** Implementarea unor programe de instruire dedicate angajaților implicați în monitorizarea implementării și evaluarea rezultatelor.
- **Claritatea indicatorilor:** Stabilirea clară a formulelor sau metodelor de calcul al valorilor de referință pentru fiecare obiectiv general și specific, în vederea evaluării corecte a gradului de realizare a obiectivelor stabilite.
- **Planificare și monitorizare financiară:** Instituirea unui mecanism unitar de planificare și monitorizare financiară care să asigure corelarea clară dintre acțiuni, sursele de finanțare și alocările bugetare efective.
- **Capacitate instituțională:** Consolidarea capacității instituționale a autorităților responsabile, inclusiv prin instruirea angajaților implicați în managementul programelor și raportarea rezultatelor.
- **Responsabilizare instituțională:** Responsabilizarea subdiviziunilor și instituțiilor implicate în implementarea Programului național de dezvoltare a protecției civile pentru anii 2026-2030, în vederea asigurării corelării informațiilor raportate cu indicatorii de impact stabiliți.
- **Continuitatea dezvoltării sistemelor:** Asigurarea continuității în dezvoltarea sistemelor de avertizare publică și modernizarea capacităților tehnice și operaționale aferente acestora.
- **Relevanța indicatorilor de impact:** Revizuirea formulării indicatorilor astfel încât aceștia să reflecte mai clar prioritățile de dezvoltare privind operaționalizarea serviciilor, calitatea intervențiilor și sporirea nivelului de siguranță în societate.
- **Monitorizarea financiară**: Instituirea unui mecanism distinct de monitorizare a mijloacelor financiare alocate pentru implementarea programelor sectoriale, care să permită evidențierea clară a alocațiilor aprobate anual din bugetul de stat și urmărirea execuției acestora pe acțiuni și obiective, în vederea sporirii transparenței și eficienței utilizării resurselor publice.
